

NÁSLEDNÉ HODNOCENÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER



Strategický plán LEADER pro období 2009 – 2013

MAS 21, o. p. s.

finální VERZE

Zpracovatelé:

Evaluační tým MAS 21, o. p. s.

Ing. Jana Klusáková

Ing. Karolína Slabejová

Ing. Mgr. Olga Blašková

Externí spolupracovník:

Michal Prekop

Konzultant:

Centrum pro komunitní práci Západní Čechy

Mgr. Tomáš Svoboda

Datum vypracování: 16. 10. 2015



mas21



Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Obsah

1. Úvod	4
1.1 Název MAS	4
1.2 Datum podpisu Dohody se SZIF	4
1.3 Základní údaje	4
2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu	6
2.1 Složení SPL.....	6
2.1.1 Přehled cílů	6
2.1.2 Přehled priorit.....	7
2.1.3 Přehled Fichí	7
2.1.4 Přehled aktualizací SPL	10
2.2 Předpokládaný a skutečně čerpaný rozpočet dle Fichí.....	13
2.3 Alokace.....	14
2.4 Výzvy	15
3. Metodický přístup	18
3.1 Pracovní tým	18
3.2 Zdroje údajů	18
3.3 Monitorovací indikátory.....	19
3.4 Hodnotící otázky	20
3.4.1 Povinné hodnotící otázky	20
3.4.2 Další zvolené hodnotící otázky	21
3.5 Způsob zodpovězení hodnotících otázek.....	21
4. Odpovědi na hodnotící otázky.....	22
4.1 Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a diverzifikaci? 22	
4.1.1 Jak přispěla podpora k vytváření nových pracovních míst?	22
4.1.2 Jak napomohla podpora k diverzifikaci činnosti místních zemědělců?	22
4.1.3 Odpověď na hodnotící otázku	23
4.2 Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?.....	23
4.2.1 Jak napomohla podpora ke zkvalitnění života obyvatel v sídlech? (cíl – Atraktivní a dostupná obec).....	23
4.2.2 Jak napomohla podpora k větší různorodosti venkovské ekonomiky? (cíl – Ekonomicky pestrý venkov)	24
4.2.3 Jak napomohla podpora k docenění a využití přírodního bohatství a kulturního dědictví území? (cíl – Podpora venkovského cestovního ruchu)	24



4.3 Do jaké míry byl implementován přístup LEADER?	25
4.3.1 Jak přispěla podpora k uplatnění inovačních postupů?	25
4.3.2 Jak přispěla podpora k realizaci projektů spolupráce MAS?	26
4.3.3 Přispěla podpora k zapojení MAS do sítí místních partnerství?	28
4.3.4 Odpověď na hodnotící otázku	30
4.4 Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení místní správy?.....	31
4.4.1 Jak podpora zlepšila možnost setkávání místních obyvatel?	31
4.4.2 Byla podpora rozložena rovnoměrně do celého území?	31
4.4.3 Přispěla podpora k iniciaci dalších (případně navazujících) aktivit?.....	32
4.4.4 Odpověď na hodnotící otázku	32
4.5 Byla aktivita MAS v procesu implementace SPL dostatečná?.....	33
4.5.1 Byla propagace jednotlivých Výzev dostatečná?.....	33
4.5.2 Byly dodržovány administrativní postupy stanovené v SPL?.....	33
4.5.3 Naplnila implementace SPL předpokládané dopady SPL?.....	34
4.5.4 Odpověď na hodnotící otázku	34
5. Závěry a doporučení	35
5.1 Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi Fichemi dle SPL.....	35
5.2 Míra dosažení cílů	35
5.3 Doporučení na základě výsledku hodnocení.....	36
Přílohy.....	37





1. Úvod

1.1 Název MAS

MAS 21, o. p. s.

IČ: 264 08 309

Sídlo: Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe

Kancelář: K Nemocnici 2381/2, 350 02 Cheb

www: www.mas21.cz

1.2 Datum podpisu Dohody se SZIF

Dohoda o poskytnutí dotace mezi Státním zemědělským fondem a MAS byla podepsána dne 27. 8. 2009.

1.3 Základní údaje

MAS 21, o. p. s. (dále jen MAS 21) byla založena zakládací smlouvou dne 15. 12. 2005 a byla zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Plzni oddíl O, vložka č. 96.

V roce 2011 byla Zakládací smlouva uvedena do souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších úprav (znění účinné ke dni 1. 1. 2011), dále jen Zákon, a to Dohodou o změně zakládací smlouvy (MAS 21 - ZAKL/2011/1) platnou a účinnou od 18. 3. 2011. Současně byl upraven Statut Společnosti tak, aby byl v souladu se Zákonem.

V září 2014 byl správní radou vydán a schválen nový Statut Společnosti, kterým došlo k úpravě vnitřního organizačního uspořádání Společnosti. Byla zřízena organizační složka Společnosti, ve které působí místní partnerství pod názvem MAS 21. V červnu 2015 došlo k aktualizaci Statutu Společnosti.

Území MAS 21 leží v okrese Cheb v Karlovarském kraji, na hranicích se Spolkovou republikou Německo a tvoří ho správní území 35 obcí. Územní působnost MAS 21 se od založení rozšířila o obec Zádub – Závíšíň (v roce 2012) a město Františkovy Lázně (v roce 2014). Realizace SPL neprobíhala na území města Františkovy Lázně, proto není zahrnuto do následujícího textu, ani analýzy. V tabulce 1 jsou porovnány údaje uvedené ve Strategickém plánu LEADER pro období 2009 – 2013 (schválen 23. 10. 2008) se stavem k 31. 12. 2014. Na území města Františkovy Lázně neprobíhala realizace SPL, proto nejsou Františkovy Lázně zahrnuty do následující analýzy.



Tabulka 1: Základní údaje o MAS 21 o. p. s.


	Původní stav*	Stav k 31. 12. 2014 **
Počet obcí	33	34
Počet obyvatel	50 768	50 388
Rozloha MAS (km²)	733,77	740,18
Počet partnerů celkem	17	29
veřejný sektor	7	9
neveřejný sektor	10	20

* dle SPL předloženého k registraci Žádosti o realizaci SPL

** údaje vztažené k SPL 2007 – 2013

Z celkového počtu partnerů 29 je 9 z veřejného sektoru (4 mikroregiony, 1 muzeum a 4 samostatné obce), 12 neziskových organizací, 4 podnikatelské subjekty a 4 zemědělské podnikatelské subjekty.

Graf 1: Struktura partnerů MAS k 31. 12. 2014



Mezi roky 2009 a 2015 ukončili svou účast v MAS 21, o. p. s. 4 partneři (Sdružení obcí a firem – Chebská pánev, ZÁPADNÍ STAVEBNÍ DL a. s. a SPORT SERVIS ML, s.r.o., ZO ČSOP Kladská), přistoupilo 16 partnerů převážně z neveřejného sektoru (Příloha 1).



2. Popis SPL, Fichí a rozpočtu

2.1 Složení SPL

Strategický plán LEADER pro období 2009 – 2013 (SPL) se opírá o strategické dokumenty, ve kterých je zahrnuto území MAS 21 nebo jeho části. Jedná se o dokumenty vytvořené za účasti aktivní veřejnosti a odborných garantů. Všechny podkladové dokumenty byly veřejně projednány. Jedná se především o následující strategie:

- Integrovaná rozvojová strategie venkovských regionů Chebska
- Urbanistická studie vedlejší rozvojové osy Karlovarského kraje – oblast kolem silnice I/21
- Strategie rozvoje mikroregionu Ašsko
- Strategická studie rozvoje mikroregionu Chebská pánev
- Strategická studie rozvoje mikroregionu Mariánskolázeňsko

2.1.1 Přehled cílů

V SPL není přímo uvedený strategický cíl, jsou pouze definovány problémové okruhy, jejichž řešení bylo považováno za prioritní. Hlavním cílem, který nepřímo vyplývá ze SPL, je podporovat vytvoření udržitelných ekonomických aktivit jako jednoho z nástrojů pro vytvoření vztahu obyvatel k venkovskému prostoru.

Problémové okruhy MAS 21 uvedené v SPL (verze k 23. 10. 2008)

- jedná se o v minulosti státem záměrně zdevastované příhraniční území, jehož rozvoj (až na výjimky) nebyl podporován; důsledkem toho je nízká vybavenost sídel základní technickou infrastrukturou a službami; neatraktivnost a zanedbanost sídel je jednou z příčin vytlídňování venkovského území (trvalé obyvatelstvo) a koncentrace ekonomických aktivit do větších měst a „střediskových“ obcí,
- malá různorodost venkovské ekonomiky,
- území je poznamenáno nedostatečnou historickou vazbou obyvatelstva k sídlům a krajině, chybí tradice (fenomén Sudet),
- přírodní bohatství a kulturní dědictví území není doceněno a využito k udržitelným ekonomickým aktivitám ani jako nástroj pro vytvoření vztahu obyvatel k venkovskému prostoru.

Cíle vycházející z problémových okruhů:

- Atraktivní a dostupná obec.
- Ekonomicky pestrý venkov (diverzifikace venkovské ekonomiky, modernizace zemědělské venkovské ekonomiky).
- Podpora venkovského cestovního ruchu.

V rámci aktualizace SPL v roce 2011 byly přidány nové Fiche a cíle strategie se tak rozšířily o:

- Aktivní venkov



2.1.2 Přehled priorit

V SPL nejsou uvedeny priority, pouze předpokládané dopady realizace SPL, ze kterých lze priority odvodit.

Předpokládané dopady realizace SPL uvedené v SPL (verze k 23. 10. 2008):

- Vybudování dopravní a technické infrastruktury sídel je podmiňujícím faktorem pro další rozvoj venkovských území, teprve následně lze realizovat projekty související s bydlením, občanskou vybaveností, službami a podnikatelskými provozy.
- Diverzifikace činností nezemědělské povahy pomůže snížit ekonomickou závislost místního hospodářství na podnikání v zemědělství, nastartuje konkrétní formy spolupráce podnikatelů se subjekty veřejné správy a nestátními neziskovými organizacemi.
- Modernizace zemědělských podniků přispěje ke stabilitě venkovského prostoru při podpoře zaměstnanosti.

V rámci aktualizace vycházející ze střednědobé evaluace byly doplněny následující dopady (k 19. 10. 2011):

- Zkvalitnění občanského vybavení a služeb přispěje k rozvoji volnočasových aktivit místních obyvatel a k posílení lokální identity a mezilidských vztahů.
- Obnovené kulturní dědictví venkova.

2.1.3 Přehled Fichí

Fiche č. 1	
Název:	Atraktivní a dostupná obec
Hlavní opatření:	III. 2. 1. 1. Obnova a rozvoj vesnic záměr: a) zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí b) vodovody, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu
Příjemci dotace	- obce a příspěvkové organizace zřízené obcí a svazky obcí, - nestátní neziskové organizace, - zájmová sdružení právnických osob, - církve a jejich organizace.
Způsobilé výdaje:	50 000 – 2 000 000 Kč
Výše dotace:	90 %
Zaměření podpory:	- stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení) budov a ploch – případně nová výstavba související s vodohospodářskou infrastrukturou včetně řešení dopravní infrastruktury a úpravou veřejných prostranství, - nákup budov, strojů, technologie, zařízení, vybavení, - hardware a software v souvislosti s projektem, - nákup a výsadba veřejné zeleně, parkové úpravy v obci, - technická dokumentace.
Aktualizace	19. 10. 2011; 26. 11. 2012



Fiche č. 2	
Název:	Pestrý venkov
Hlavní opatření:	III. 1. 1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy záměr: a) diverzifikace činností nezemědělské povahy d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
Vedlejší opatření:	I. 1. 1. 1. Modernizace zemědělských podniků
Příjemci dotace	- Fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě min. 2 roky v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb. O zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Způsobilé výdaje:	200 000 – 2 000 000 Kč
Výše dotace:	40 % (50 %, 60 %) podle zařazení žadatele dle velikosti podniku
Zaměření podpory:	<ul style="list-style-type: none"> - nová výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba provozovny určené pro nezemědělskou činnost, - nákup strojů, technologií a dalších zařízení sloužících k diverzifikaci do nezemědělských činností, - propagaci a marketing, - výstavba, rekonstrukce, modernizace či přestavba zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv, - nákup pozemků a staveb v souvislosti s projektem, - investice do zařízení pro chov zvířat, skladů pro zemědělské produkty, zemědělské techniky a strojního vybavení, - technická dokumentace.
Aktualizace	9. 3. 2011; 26. 11. 2012

Fiche č. 3	
Název:	Venkovský cestovní ruch
Hlavní opatření:	III. 1. 3. 2. Ubytování, sport
Příjemci dotace	<ul style="list-style-type: none"> - zemědělský podnikatel, - obce, příspěvkové organizace zřízené obcí a svazky obcí, - nestátní neziskové organizace, - zájmová sdružení právnických osob, - nezemědělské podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti cestovního ruchu.
Způsobilé výdaje:	50 000 – 2 000 000 Kč
Výše dotace:	40 % (50 %, 60 %) podle zařazení žadatele dle velikosti podniku
Zaměření podpory:	<ul style="list-style-type: none"> - stavba, modernizace, rekonstrukce nebo přestavba malokapacitního ubytovacího či stravovacího zařízení, půjčovny sportovních potřeb, sportovních zařízení, - nákup vybavení pro malokapacitní ubytovací nebo stravovací zařízení - nákup vybavení a sportovních potřeb pro půjčovny sportovních potřeb, - nákup nezbytné výpočetní techniky, - propagace a marketing, - nákup staveb a pozemků v souvislosti s projektem, - technická dokumentace.
Aktualizace:	9. 3. 2011; 26. 11. 2012



Fiche č. 4	
Název:	Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Hlavní opatření:	III. 2. 2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví
Vedlejší opatření:	III. 1. 3.1 Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky
Příjemci dotace	<ul style="list-style-type: none"> - obce, příspěvkové organizace zřízené obcí a svazky obcí, - nestátní neziskové organizace, - zájmová sdružení právnických osob, - církve a jejich organizace, - fyzické a právnické osoby podnikající.
Způsobilé výdaje:	50 000 – 1 500 000 Kč
Výše dotace:	90 %
Zaměření podpory:	<ul style="list-style-type: none"> - zpracování studií obnovy a využití kulturního dědictví, - zpracování programů regenerace památkově chráněných území, - zpracování soupisů a map kulturního dědictví na venkově, - publikační činnost a propagace projektu, - stavební obnova a revitalizace památkových budov a kulturních objektů a prvků, - revitalizace historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů i solitérních dřevin, - zajištění historických průzkumů, - realizace výstavních expozic a muzeí, - tvorba, obnova a rozšíření tras a stezek, - výsadba doprovodné zeleně, - rekonstrukce a nová výstavba rozhleden, - nákup staveb a pozemků v souvislosti s projektem, - technická dokumentace.
Aktualizace:	19. 10. 2011; 26. 11. 2012

Fiche č. 5	
Název:	Aktivní venkov I
Hlavní opatření:	III. 2. 1. 2 Občanské vybavení a služby
Příjemci dotace	<ul style="list-style-type: none"> - obce a svazky obcí, - nestátní neziskové organizace, - zájmová sdružení právnických osob.
Způsobilé výdaje:	20 000 – 2 000 000 Kč
Výše dotace:	90 %
Zaměření podpory:	<ul style="list-style-type: none"> - občanské vybavení v oblasti sociální a kulturní infrastruktury, péče o děti, vzdělání, zdraví, sportu, volnočasových aktivit, - občanské vybavení v souvislosti s církevními aktivitami, - občanské vybavení v oblasti vybavenosti pro veřejnou správu, informačních a školících center s využíváním ICT, budov hasičských zbrojnic a zvířecích útulků, - prodejna smíšeného zboží, stabilní stánky, pošta, - nákup staveb a pozemků v souvislosti s projektem, - technická dokumentace.
Aktualizace:	26. 11. 2012



Fiche č. 6	
Název:	Aktivní venkov II
Hlavní opatření:	III. 2. 1. 2 Občanské vybavení a služby
Příjemci dotace	<ul style="list-style-type: none"> - nestátní neziskové organizace, - církve a jejich organizace, - příspěvkové organizace zřízené obcí.
Způsobilé výdaje:	20 000 – 200 000 Kč
Výše dotace:	90 %; 40 % (50 %, 60 %) podle režimu podpory a zařazení žadatele dle velikosti podniku
Zaměření podpory:	<ul style="list-style-type: none"> - občanské vybavení v oblasti sociální a kulturní infrastruktury, péče o děti, vzdělání, zdraví, sportu, volnočasových aktivit, - občanské vybavení v souvislosti s církevními aktivitami, - občanské vybavení v oblasti vybavenosti pro veřejnou správu, informačních a školicích center s využíváním ICT, budov hasičských zbrojnic a zvířecích útulků, - prodejna smíšeného zboží, stabilní stánky, pošta, - nákup staveb a pozemků v souvislosti s projektem, - technická dokumentace.
Aktualizace:	26. 11. 2012; 10. 12. 2013

2.1.4 Přehled aktualizací SPL

SPL byl aktualizovaný 6x za celé programové období. Změny byly nejčastěji provedeny v souvislosti se změnou personálního obsazení v jednotlivých orgánech MAS 21, se změnou na postu manažera SPL nebo ředitele společnosti, se změnou administrativních postupů či se změnou Fichí. Dvakrát za období bylo v souvislosti s přípravou na novou Výzvu MAS podáno Hlášení o změnách, které změnilo Fiche, ale neovlivnilo znění SPL.

1. Změna SPL k 9. 4. 2010

- personální změny v orgánech MAS,
- změna názvů partnerů,
- úprava interních předpisů po Výzvě1.

2. Hlášení o změnách k 9. 3. 2011

Na základě Hlášení o změnách nedošlo ke změně SPL, pouze k úpravě formulářů 2 Fichí.

- Úprava Fiche 2 „Pestrý venkov“
 - snížení minimální částky způsobilých výdajů z 500 000 Kč na 200 000 Kč z důvodů rozšíření možností pro méně finančně náročné projekty,
 - rozšíření o záměr d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv z důvodů rozšíření možnosti diverzifikace,
 - úprava a rozšíření preferenčních kritérií (podpora projektů zaměřených na rozšíření stávající malé různorodosti venkovské ekonomiky, na využívání místních zdrojů a na rozvoj regionu celkově),
 - úprava a rozšíření kritérií pro monitoring a hodnocení tak, aby byly sledovány konkrétní ukazatele s ohledem na přínos Fiche pro rozvoj území MAS 21,
 - upraven postup při shodném počtu bodů.



- Úprava Fiche 3 „Venkovský cestovní ruch“
 - rozšířena nabídka příjemců dotace dle možností nové metodiky (z důvodu využití rozšířených možností rozvoje cestovního ruchu v regionu),
 - úprava preferenčních kritérií (podpora projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v regionu),
 - úprava kritérií pro monitoring a hodnocení tak, aby vyhovovala cílům Fiche a SPL,
 - upraven postup při shodném počtu bodů.

3. Změna SPL k 19. 10. 2011

Významná změna SPL byla provedena na základě výsledků střednědobého hodnocení SPL a na základě rozšíření počtu Fichí.

- aktualizace interních procesů MAS podle současného stavu a nové metodiky (kontrola činnosti MAS, archivace, monitoring projektů, realizace SPL),
- aktualizace postupu při administraci a kontrole projektů dle současné praxe a nové metodiky (registrace, výběr a hodnocení projektů),
- aktualizace finančních zdrojů,
- úprava způsobu poskytování informací o MAS,
- rozšíření pojmu inovace,
- změna monitorovacích indikátorů v SPL (viz. 3.3 Monitorovací indikátory),
- Úprava Fiche 1 „Atraktivní a dostupná obec“
 - úpravy se změnou metodiky – úprava režimů podpory, atd.
 - snížení minimální částka způsobilých výdajů z 500 000 Kč na 50 000 Kč z důvodů rozšíření možností pro méně finančně náročné projekty,
 - úprava preferenčních kritérií stanovených MAS,
 - změna postupu při shodném počtu bodů,
 - úprava kritérií pro monitoring a hodnocení tak, aby vyhovovala cílům Fiche a SPL.
- Úprava Fiche 4 „Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova“
 - úpravy v souvislosti se změnou metodiky - vedlejší opatření přejmenováno na III.1.3.1 „Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky a další tematické stezky“, úprava režimů podpory, atd.
 - rozšíření příjemců dotace - fyzické a právnické osoby podnikající dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 - úprava preferenčních kritérií stanovených MAS,
 - změna postupu při shodném počtu bodů,
 - úprava kritérií pro monitoring a hodnocení tak, aby vyhovovala cílům Fiche a SPL.
- Nová Fiche 5 „Aktivní venkov I“
- Nová Fiche 6 „Aktivní venkov II“

4. Změna SPL k 15. 12. 2011

- Personální změny v orgánech MAS,
- Jmenování nového statutárního zástupce.

5. Hlášení o změnách k 26. 11. 2012



Na základě Hlášení o změnách nedošlo ke změně SPL, pouze k úpravě formulářů všech Fichí před vyhlášením 5. Výzvy.

- Úprava Fiche 1 „Atraktivní a dostupná obec“
 - úpravy v souvislosti se změnou metodiky – např. rozšíření příjemců dotace (příspěvkové organizace zřízené obcí),
 - úprava preferenčních kritérií stanovených MAS,
 - změna postupu při shodném počtu bodů.
- Úprava Fiche 2 „Pestrý venkov“
 - úprava preferenčních kritérií stanovených MAS,
 - změna postupu při shodném počtu bodů.
- Úprava Fiche 3 „Venkovský cestovní ruch“
 - úpravy v souvislosti se změnou metodiky – např. rozšíření příjemců dotace (příspěvkové organizace zřízené obcí),
 - snížení minimální částky způsobilých výdajů z 100 000 Kč na 50 000 Kč z důvodů rozšíření možností pro méně finančně náročné projekty,
 - úprava preferenčních kritérií stanovených MAS,
 - změna postupu při shodném počtu bodů.
- Úprava Fiche 4 „Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova“
 - úpravy v souvislosti se změnou metodiky – např. rozšíření příjemců dotace (příspěvkové organizace zřízené obcí),
 - úprava preferenčních kritérií stanovených MAS,
 - změna postupu při shodném počtu bodů.
- Úprava Fiche 5 „Aktivní venkov I“
 - úpravy v souvislosti se změnou metodiky – např. změna kritérií přijatelnosti, dalších podmínek,
 - úprava preferenčních kritérií stanovených MAS,
 - změna postupu při shodném počtu bodů.
- Úprava Fiche 6 „Aktivní venkov II“
 - úpravy v souvislosti se změnou metodiky – např. rozšíření příjemců dotace (příspěvkové organizace zřízené obcí), změna kritérií přijatelnosti, dalších podmínek,
 - úprava preferenčních kritérií stanovených MAS,
 - změna postupu při shodném počtu bodů.

6. Změna SPL k 24. 5. 2013

- jmenování nového statutárního zástupce,
- změny v Seznamu partnerů a zaměstnanců MAS.

7. Změna SPL k 5. 12. 2013

- úprava procesu výběru projektů dle praxe a metodiky,
- oprava údajů o lidských zdrojích MAS (souvislost se změnou z 24. 5. 2013).

8. Hlášení o změnách k 10. 12. 2013

- úprava Fiche 6 „Aktivní venkov II“
 - úprava režimů podpory.



2.2 Předpokládaný a skutečně čerpaný rozpočet dle Fichí

Tabulka 2: Předpokládaný a skutečně čerpaný rozpočet IV.1.2

	% z rozpočtu (dle platného SPL)	% z rozpočtu (stav k 30. 6. 2015)	Podané žádosti na MAS		Schválené žádosti SZIF		Proplacené projekty	
			ks	Kč (v tis.)	ks	Kč (v tis.)	ks	Kč (v tis.)
Fiche 1	20	27	20	16 706	9	7 408	9	6 574
Fiche 2	10	-	4	3 595	2	1 873	0*	0
Fiche 3	25	18	7	7 735	6	6 735	4**	4 432
Fiche 4	15	25	19	11 334	15	6 666	14	5 993
Fiche 5	20	18	27	8 079	12	5 002	11***	4 415
Fiche 6	10	12	32	4 019	21	2 872	21	2 789
Celkem	100	100	109	51 468	65	30 556	59	24 203

Pozn: * Ing. Petr Potůček – Opravárenská dílna zemědělské techniky

** Alexandra Vašková – Zateplení fasády a podkroví objektu č. p. 8 Pomezí n. Ohří

*** Obec Krásná – Pořízení školního autobusu

K 30. 6. 2015 byly v rámci opatření IV.1.2 „Realizace místní rozvojové strategie“, Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007- 2013, podány Žádosti o proplacení výdajů (ŽoP) všech schválených projektů. Celkem bylo k danému datu proplaceno 59 projektů v celkové výši 24 202 854,- Kč.

K 30. 6. 2015 nebyly proplaceny 3 projekty, 2 projekty z 5. Výzvy a 1 projekt ze 6. Výzvy MAS. Pokud budou uvedené ŽoP proplaceny dle požadavků, navýší se celková částka dotace o 2 217 678,- Kč. V takovém případě bude výše finančních prostředků, které MAS mezi roky 2009 a 2015 přinesla do spravovaného území v rámci opatření IV.1.2 PRV, 26 420 532,- Kč.

Tabulka 3: Přehled neproplacených Žádosti o proplacení výdajů k 30. 6. 2015


Výzva MAS	Kolo PRV	Název příjemce dotace	Název projektu	Termín podání ŽoP	Dotace (Kč)
5.	18.	Ing. Petr Potůček	Opravárenská dílna zemědělské techniky	25. 5. 2015	799 995
5.	18.	Alexandra Vašková	Zateplení fasády a podkroví objektu č. p. 8, Pomezí nad Ohří	29. 6. 2015	982 183
6.	20.	Obec Krásná	Pořízení školního autobusu	11. 5. 2015	435 500

V roce 2011 byly přidány dvě Fiche a aktualizováno rozvržení finančních prostředků mezi Fichemi do roku 2013. K 30. 6. 2015 nebyl finanční plán naplněn ve Fichí 2, 3 a 5.

Ve Fichí 2 „Pestrý venkov“ byly za celé období na MAS přijaty 4 Žádosti o dotaci, SZIF schválil 2 a proplacen bude pravděpodobně pouze jeden zrealizovaný projekt (Ing. Petr Potůček). V rámci Výzvy č. 3 byly na MAS podány 3 projekty do Fiche 2. Projekt žadatele E-PLACE.CZ Limited s názvem „Peletovací lis s rozdužovačem“ byl vyřazen v rámci kontroly na MAS, ještě před zasedáním výběrové komise. Projekt s názvem „Moštárna“ žadatele Zemědělské družstvo Křižovatka byl ukončen SZIF v rámci administrativní kontroly. Projekt s názvem „Modernizace výrobního zařízení ve stávajícím objektu – výroba tvarovaných biopaliv“ byl na žádost příjemce Václava Jedličky ukončen před podáním žádosti o proplacení na jeho vlastní žádost.



Graf 2: Porovnání plánovaného a skutečného rozložení finančních prostředků mezi Fichemi k 30. 6. 2015

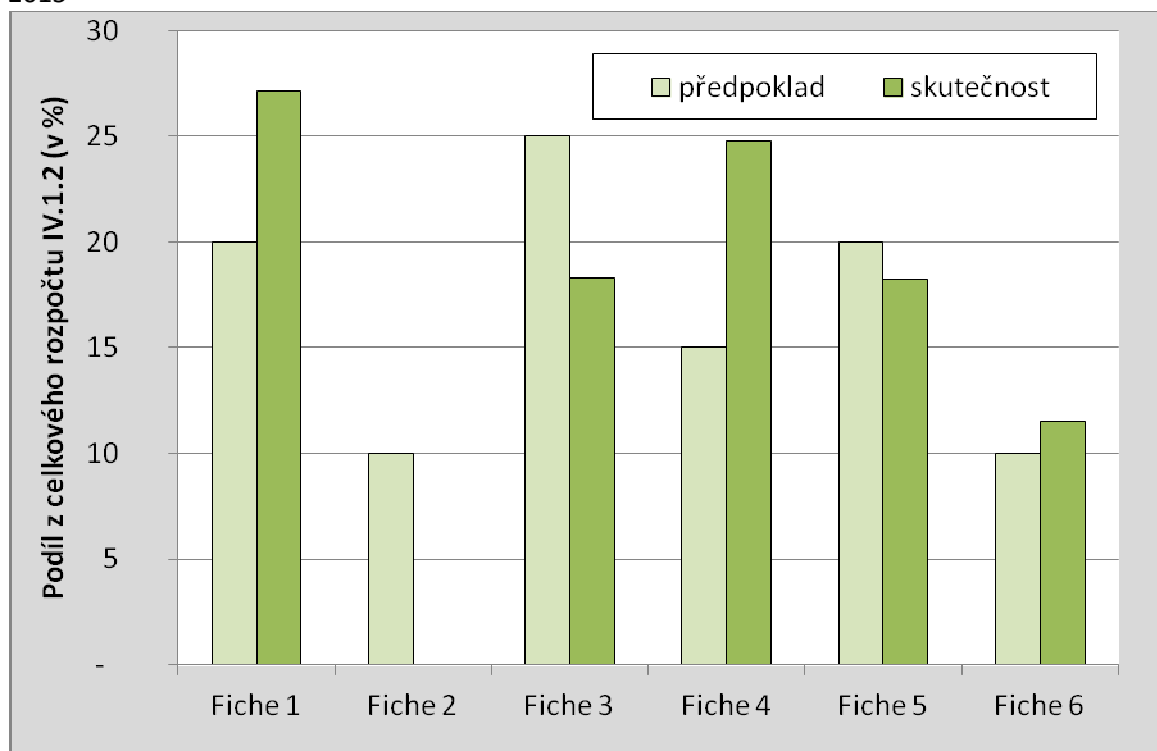

V rámci Fiche 3 „Venkovský cestovní ruch“ bylo na MAS podáno 7 Žádostí o dotaci a úspěšně zrealizovány a proplaceny byly 4. Ve Výzvě č. 3 byl schválen k financování projekt žadatele Terezie Kletečkové s názvem „Rekonstrukce objektu na malokapacitní zařízení a zařízení půjčovny sportovních potřeb“. Projekt byl ukončen na žádost příjemce dotace před podáním Žádosti o proplacení. V 5. Výzvě získal projekt názvem „KARTARÉNA YPSILONKA – prodloužení trati“ nejnižší počet bodů při hodnocení výběrovou komisí. Žadatel nebyl ochoten ponížít výši dotace tak, aby byla vyčerpána finanční alokace na Fichi 3, Žádost o dotaci žadatele KARTARÉNA s.r.o. nebyla doporučena k podpoře, tzn. nebyla předána na SZIF. U projektu paní Alexandry Vaškové, která podala projekt v 5. Výzvě MAS, probíhá kontrola Žádosti o proplacení.

2.3 Alokace

Mezi roky 2009 a 2013 bylo pro MAS 21, o. p. s. alokováno 32 313 570 Kč, z toho se na provoz kanceláře a související výdaje využilo 17, 62 % finančních prostředků (5 695 052,- Kč). Provoz kanceláře byl z prostředků PRV hrazen i v roce 2014, kdy proběhla poslední Výzva. K 30. 6. 2015 bylo v rámci opatření IV.1.2 do území MAS 21 rozděleno 24 202 854,- Kč. Největší částka byla rozdělena v roce 2012 v rámci 4. Výzvy MAS.



Tabulka 4: Přehled čerpání alokace IV.1.2 k 30. 6. 2015

	Celková alokace (Kč)	Alokace IV.1.2 (Kč)	Zazávazkováno IV.1.2 (Kč)	Proplaceno IV.1.2 (Kč)
2009	5 543 227	4 884 717	3 693 027	3 605 390
2010	5 683 291	4 862 248	3 939 492	3 527 010
2011	5 530 433	4 426 257	4 672 505	2 397 685
2012	7 614 226	6 091 381	8 263 771	7 756 831
2013	7 942 393	6 353 915	7 731 885	5 430 409*
2014	-	-	1 948 993	1 485 529*
celkem	32 313 570	26 618 518	30 249 673	24 202 854

Pozn. * Do 30. 6. 2015 nebyly proplaceny všechny projekty.

Pokud by byly proplaceny všechny podané Žádosti o proplacení, celková částka za opatření IV.1.2 by byla 26 420 532,- Kč (81,76 % alokace pro MAS 21). Částka, kterou se nepodařilo využít, je 197 986,- Kč (0,61 % alokace pro MAS 21).

Rozdíl mezi částkou finančních prostředků zazávazkovaných a skutečně proplacených je způsoben především odstoupením 2 velkých projektů před podáním Žádosti o proplacení (Terezie Kletečková - Rekonstrukce objektu na malokapacitní ubytovací zařízení a zařízení půjčovny sportovních potřeb, požadovaná dotace 1 200 000,- Kč; Václav Jedlička – Modernizace výrobního zařízení ve stávajícím objektu – výroba tvarovaných biopaliv, požadovaná dotace 1 073 226,- Kč) a znovupoužitím nevyčerpaných finančních prostředků z proplacených Žádostí o proplacení.

2.4 Výzvy

Mezi roky 2009 a 2014 vyhlásila MAS 21 celkem 6 Výzev, v každém roce realizace jednu.

Tabulka 5: Přehled Výzev MAS 21 a vyhlášených Fichí

	Kolo PRV	Vyhlášení	Příjem ŽoD	Fiche					
				1	2	3	4	5	6
1. Výzva	8.	1. 9. 2009	29. - 30. 9. 2009	x	x	X	x		
2. Výzva	10.	30. 3. 2010	21. 5. 2010	x	x	x	x		
3. Výzva	13.	26. 4. 2011	23. 5. 2011		x	x			
4. Výzva	15.	14. 12. 2011	31. 1. - 1. 2. 2012	x	x	x	x	x	x
5. Výzva	18.	27. 12. 2012	1. 2. - 5. 2. 2013	x	x	x	x	x	x
6. Výzva	20.	8. 1. 2014	10. 2.- 12. 2. 2014					x	x

Celkem bylo na MAS přijato 109 Žádostí o dotaci, ke kontrole na SZIF jich bylo předáno 70. V průběhu administrativní kontroly podaných projektových záměrů byly na MAS ukončeny dva projekty. Výběrová komise nevybrala 35 projektů, a to především z důvodu nízké finanční alokace na danou Fichi v rámci Výzvy. Tři projekty byly ukončeny v rámci administrativní kontroly na SZIFu a dva projekty nebyly SZIF schváleny k podpoře. Přehled všech Žádostí o dotaci podaných na MAS je uveden v příloze 2.



Výzva č. 1

V rámci 1. Výzvy byl projekt Města Luby na výstavbu parkoviště u zdravotního střediska vyloučen na MAS z administrativních důvodů – opravená žádost o dotaci nebyla doručena na MAS v předepsaném termínu. Projekt Mariánskolázeňska na vypracování studie o kulturním dědictví byl vyloučen SZIF při administrativní kontrole – nebyla předložena povinná příloha. Zbývajících 6 žádostí bylo schváleno ke spolufinancování. Realizace byla úspěšně ukončena u všech 6 projektů.

Výzva č. 2

V této výzvě bylo předloženo k registraci na RO SZIF všech 10 podaných žádostí o dotaci, z toho 9 žádostí vybraných a 1 náhradní. Všechny vybrané žádosti byly schváleny ke spolufinancování. V průběhu měsíce prosince 2010, před podepsáním Dohody o poskytnutí dotace, byla ukončena administrace projektu na obnovu hřbitova v Trstěnicích z důvodů rozhodnutí zastupitelstva obce o nepodepsání Dohody o poskytnutí dotace. Zbývajících 8 schválených žadatelů podepsalo Dohody o poskytnutí dotace na RO SZIF v Ústí nad Labem a úspěšně svůj záměr zrealizovalo.

Výzva č. 3

V rámci 3. Výzvy, která byla vyhlášena pouze pro Fichi č. 2 a č. 3 bylo podáno na MAS 6 Žádostí o dotaci. V rámci administrativní kontroly byla vyloučena žádost na pořízení paletovacího lisu s rozduřovačem žadatele E-PLACE.CZ a zbývajících 5 bylo hodnoceno výběrovou komisí a následně doporučeno ke spolufinancování. V rámci administrativní kontroly na SZIF byly vyloučen projekt Zemědělského družstva Křižovatka na pořízení Moštárny a krmného, řezacího a míchacího stroje. Zbýající žadatelé podepsali Dohody o poskytnutí dotace. Dne 3. 9. 2012 byla na vlastní žádost žadatele ukončena administrace Žádosti o dotaci žadatele Terezie Kletečkové. Dne 23. 10. 2013 byla na vlastní žádost žadatele ukončena administrace projektu žadatele Václava Jedlička. Oba projekty byly ve fázi před podáním Žádosti o proplacení.

Výzva č. 4

Ve 4. Výzvě MAS 21 bylo vyhlášeno všech 6 Fichí. Na MAS bylo podáno celkem 26 Žádostí o dotaci. Dva žadatelé (Obec Valy a Obec Křižovatka) v průběhu administrace na MAS odstoupili. Výběrovou komisí tedy bylo hodnoceno 24 žádostí a 17 z nich bylo vybráno ke spolufinancování. Všichni žadatelé zrealizovali své záměry a byla jim proplacena dotace, dle požadavků uvedených v Žádosti o proplacení.

Výzva č. 5

Ve výzvě č. 5. bylo vyhlášeno všech 6 Fichí. Na MAS bylo podáno celkem 34 Žádostí o dotaci. Výběrovou komisí bylo hodnoceno všech 34 žádostí o dotaci a 21 bylo doporučeno ke spolufinancování. Projekt na obnovu vybavení ve školní zahradě v Drmoulu byla vyloučena na SZIF v průběhu administrativní kontroly SZIF. Projekt Obce Hazlov s názvem „Studie obnovy Horní hospody a zámeckého parku“ nebyla SZIF schválena k podpoře. V současné době jsou všechny projekty zrealizovány a 19 má již proplacenou dotaci.

Na výzvu SZIF byly přebodovány některé žádosti o dotaci ve Fichi č. 6, z důvodu chybného bodování za preferenční kritérium „Žadatel rekonstruuje existující objekt/využívá nevyužitá (volná) prostora“.



Nové jednání výběrové komise proběhlo dne 28. 5. 2013. Seznam doporučených žádostí se nezměnil, pouze bylo změněno pořadí projektů v rámci Fiche č. 6.

Výzva č. 6

Ve výzvě č. 6, která byla vyhlášena pouze pro Fichi č. 5 a č. 6 bylo podáno na MAS 25 Žádostí o dotaci. Výběrovou komisí bylo hodnoceno všech 25 žádostí o dotaci a 10 z nich bylo vybráno ke spolufinancování. Všechny projekty byly zrealizovány, 9 je již proplaceno.



3. Metodický přístup

3.1 Pracovní tým

Evaluační zpráva byla vypracována smíšeným typem evaluace z hlediska zpracovatele. Pracovníci MAS pod dohledem externího konzultanta (Centrum pro komunitní práci) hodnotili naplňování Strategického plánu LEADER v letech 2009 – 2014.

Interní zpracovatelé:

Ing. Jana Klusáková – manažerka MAS

Ing. Karolína Slabejová – manažerka MAS

Ing. Mgr. Olga Blašková – manažerka MAS

Externí konzultant:

Centrum pro komunitní práci – západní Čechy (Mgr. Tomáš Svoboda)

Americká 29

301 38 Plzeň

IČ: 69461091

V průběhu realizace nedošlo ke změně v pracovním týmu.

3.2 Zdroje údajů

Jako podklad pro vyhodnocení hodnotících otázek byla využita evidence dat o žadatelích/příjemcích vedená MAS, dotazníkové šetření, konzultace a rozhovory s potencionálními žadateli a s příjemci dotace a výsledky monitoringu projektů.

Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření v rámci evaluace SPL bylo provedeno mezi žadateli, členy a partnery MAS. Dotazník byl rozeslán na členy a partnery a vyvěšen na internetových stránkách www.mas21.cz.

Konzultace a rozhovory

Během konzultací a neformálních rozhovorů s žadateli, členy, partnery a dalšími aktéry venkova byly získány důležité informace o spokojenosti s činností naší místní akční skupiny a návrhy na zlepšení naší činnosti.

Výsledky monitoringu projektů

MAS 21 provádí monitoring projektů v průběhu i po realizaci záměru. V době udržitelnosti proběhla vždy alespoň jedna návštěva, kdy se provádí kontrola naplnění monitorovacích kritérií a stav projektu. Z návštěvy na místě pracovníci MAS pořídí zápis a fotodokumentaci, vše zašle příjemci a založí do složky projektu. Z diskuze s příjemci často vyplynuly návrhy, jak zkvalitnit vzájemnou komunikaci a tím i činnost MAS.



Evidence MAS

Pracovníci MAS zaznamenávají průběh (významné události) projektu od podání na MAS do konce doby udržitelnosti do excelovské tabulky. Vznikla tak přehledná evidence podaných a především podpořených projektů MAS 21, o. p. s..

Výsledky průběžného hodnocení SPL

MAS monitorovala průběh každé Výzvy od termínu vyhlášení Výzvy do proplacení posledního projektu. Byl sledován nejen počet a struktura projektů zaregistrovaných na MAS, ale i činnost a aktivita pracovníků MAS. Po podpisu poslední Dohody o poskytnutí dotace byla vždy vytvořena zpráva Hodnocení SPL, kde byl shrnut průběh administrace projektů za všechny Výzvy.

3.3 Monitorovací indikátory

Tabulka 6: Přehled naplňování monitorovacích indikátorů 2011 - 2013 (2015)

Monitorovací indikátor		Plánovaná hodnota dle platného SPL				Dosažená hodnota k 30. 6. 2015	% dosažení cílové hodnoty
		2011	2012	2013	celkem		
1	Podpořené projekty v rámci SPL (počet)	4	10	10	24	48	200
2	Zrekonstruované nebo nové komunikace III. a IV. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace (km)	0	1	1	2	1,48	74
3	Obnovené nebo nově vytvořené veřejné prostranství (m ²)	0	250	250	500	3 481	696
4	Zrekonstruovaná nebo vybudovaná vodohospodářská infrastruktura (počet)	0	1	1	2	0	0
5	Pořízené technologie (technologie – výrobní postup, technické zařízení), (počet)	1	1	1	3	1	33,3
6	Zrekonstruované/nově vzniklé objekty (počet)	4	4	4	12	17	141
7	Zavedení nových produktů nebo služeb (počet)	2	2	2	6	30	500
8	Nová ubytovací lůžka (počet)	11	5	5	21	22	105
9	Obnovené nebo zhodnocené kulturní dědictví (počet)	0	2	2	4	4	100
10	Vytvořené/obnovené/rozšířené tematické stezky (km)	0	1	1	2	0	0

Ve sledovaném období došlo k radikální změně monitorovacích indikátorů. V původní verzi SPL bylo navrženo 7 monitorovacích indikátorů a jejich hodnot ke konci roku 2010. Zhodnocení původních monitorovacích indikátorů bylo provedeno v rámci střednědobého hodnocení SPL k 30. 6. 2011.



Tabulka 7: Hodnocení monitorovacích indikátorů mezi roky 2009 a 2010

Monitorovací indikátor		Fiche č.	Plánovaná hodnota dle původního, platného SPL	Stav plnění k 31. 12. 2010*	% dosažení cílové hodnoty
MI 1	Počet podpořených projektů v rámci SPL	1, 2, 3, 4	14	14	100
MI 2	Počet podpořených projektů na dopravní a technickou infrastrukturu a zlepšení vzhledu obcí	1	6	4	67
MI 3	Počet rekonstruovaných objektů	1	4	2	50
MI 4	Počet podpořených subjektů podnikajících v zemědělství	2, 3	3	1	34
MI 5	Počet podpořených projektů v oblasti venkovského cestovního ruchu	3	3	1	34
MI 6	Délka nově vytvořených pěších a lyžařských tras, vinařských stezek a hippostezek	4	5 km	0	0
MI 7	Počet obnovených památek	4	2	9	450

Zdroj: Střednědobé hodnocení Strategického plánu LEADER (k 30.6.2011)

V rámci aktualizace SPL po střednědobém hodnocení byly nastaveny nové monitorovací indikátory a jejich plánované plnění do roku 2013 po jednotlivých letech. Porovnání plánu a skutečně dosaženého stavu je uveden v tabulce 6.

Hodnoty první sady monitorovacích indikátorů byly stanoveny za předpokladu, že přiznaná roční finanční alokace bude cca 18 000 000 Kč. Ve většině monitorovacích indikátorů byly plánované hodnoty nadhodnoceny, a proto nebylo plánované hodnoty dosaženo. Ve druhé sadě monitorovacích indikátorů došlo k podhodnocení realizace SPL v 5 z 10 monitorovacích indikátorů. V monitorovacím indikátoru 4 „Zrekonstruovaná nebo vybudovaná vodohospodářská infrastruktura“ a 10 „Vytvořené/obnovené/rozšířené tematické stezky“ nebyl realizován ani jeden projekt. Naopak monitorovací indikátory 8 „Nová ubytovací lůžka“ a 9 „Obnovené nebo zhodnocené kulturní dědictví“ se podařilo pomocí zrealizovaných projektů naplnit téměř přesně.

Indikátory, které nebyly naplněny, se převážně vážou k finančně náročnějším investicím, pro něž není metoda LEADER vhodný zdroj. Žadatelé řešili projekty přímo prostřednictvím PRV (mimo LEADER, či z jiných dotačních zdrojů). Z uvedeného vyplývá, že za MAS 21 není možné pomocí monitorovacích indikátorů SPL vysledovat naplnění plánovaného stavu území.

3.4 Hodnotící otázky

3.4.1 Povinné hodnotící otázky

- A. Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a diverzifikaci?



- a. Jak přispěla podpora k vytváření nových pracovních míst?
- b. Jak napomohla podpora k diverzifikaci činnosti místních zemědělců?
- B. Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?
 - a. Jak napomohla podpora ke zkvalitnění života obyvatel v sídlech? (cíl – Atraktivní a dostupná obec)
 - b. Jak napomohla podpora k větší různorodosti venkovské ekonomiky? (cíl – Ekonomicky pestrý venkov)
 - c. Jak napomohla podpora k docenění a využití přírodního bohatství a kulturního dědictví území? (cíl – Podpora venkovského cestovního ruchu)
- C. Do jaké míry byl implementován přístup LEADER?
 - a. Jak přispěla podpora k uplatnění inovačních postupů?
 - b. Jak přispěla podpora k realizaci projektů spolupráce MAS?
 - c. Přispěla podpora k zapojení MAS do sítí místních partnerství?
- D. Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení místní správy?
 - a. Jak podpora zlepšila možnost setkávání místních obyvatel?
 - b. Byla podpora rozložena rovnoměrně do celého území?
 - c. Přispěla podpora k iniciaci dalších (případně navazujících) aktivit?

3.4.2 Další zvolené hodnotící otázky

- A. Byla aktivita MAS v procesu implementace SPL dostatečná?
 - a. Byla propagace jednotlivých Výzev dostatečná?
 - b. Byly dodržovány administrativní postupy stanovené v SPL?
 - c. Naplnila implementace SPL předpokládané dopady SPL?

3.5 Způsob zodpovězení hodnotících otázek

Na základě SPL, který vychází ze základních potřeb regionu, byly definovány základní ukazatele, které jsou pro region MAS 21 specifické:

- Rozvoj venkovských oblastí na území MAS 21 v oblasti dopravní a technické infrastruktury a cestovního ruchu.
- Diverzifikace činností nezemědělské povahy, které pomohou snížit ekonomickou závislost místního hospodářství na podnikání v zemědělství a zvýší malou různorodost venkovské ekonomiky.
- Rozšíření spolupráce podnikatelských subjektů se subjekty veřejné správy a nestátními neziskovými organizacemi.
- Obnova kulturního dědictví.

Informace, které jsou použity v hodnocení, vychází především z dat evidovaných na MAS 21, tzn. výsledky průběžného hodnocení SPL a monitoringu projektů. Významným doplňkem bylo dotazníkové šetření a rozhovory s potencionálními žadateli a příjemci dotace. Hodnocení nezahrnuje názory subjektů a osob, které neprojevují zájem o rozvoj a dění v regionu.



4. Odpovědi na hodnotící otázky

4.1 Do jaké míry přispěla podpora k budování místních kapacit pro zaměstnanost a diverzifikaci?

4.1.1 Jak přispěla podpora k vytváření nových pracovních míst?

Tvorba nových pracovních míst není prioritním cílem SPL. Vzhledem k zaměření jednotlivých Fichí se nepředpokládá, že by nová pracovní místa vytvořená v rámci projektů LEADER výrazně ovlivnila míru nezaměstnanosti v regionu.

Dva žadatelé o dotaci deklarovali v žádosti o dotaci vznik nových pracovních míst. Oba projekty byly na MAS podány v rámci 5. Výzvy do Fiche 3 „Venkovský cestovní ruch“.

Tabulka 8: Přehled projektů, které získaly body za preferenční kritérium "Vytvoření nového pracovního místa"

Výzva	Fiche	Název žadatele	Název projektu	Počet nových prac. míst	Požadovaná dotace	Proplacená dotace
5	3	KIRCH a KIRCH s.r.o.	Malokapacitní ubytovací zařízení	1	1 197 000	1 197 000
5	3	Alexandra Vašková	Zateplení fasády a podkroví objektu č. p. 8, obec Pomezí nad Ohří	6	1 061 731	Probíhá kontrola ŽoP

Projekty, které cíleně vytvářely nová pracovní místa, byly realizovány až v druhé polovině programovacího období. Celkem bylo vytvořeno 7 nových pracovních míst díky finanční podpoře MAS 21.

4.1.2 Jak napomohla podpora k diverzifikaci činnosti místních zemědělců?

V rámci Fiche 2 „Pestrý venkov“, která je složena z opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, byl podpořen projekt s názvem „Opravárenská dílna zemědělské techniky“ žadatele Ing. Petra Potůčka. Na základě realizace tohoto projekt byla dne 18. 5. 2015 rozšířena živnostenská oprávnění žadatele o obory činnosti „Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství“ a „Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních nástrojů“.

Do Fiche 3 „Venkovský cestovní ruch“ byly podány a schváleny 4 projekty, při kterých došlo k rozšíření podnikatelské činnosti. Tři z těchto žadatelů byli před podáním Žádosti o dotaci uvedeni v evidenci zemědělských podnikatelů (Václav Jedlička, Robert Mišovský, Ing. Marek Babuška CSc.). Realizací podaných projektů došlo k rozšíření jejich živnostenských oprávnění o činnosti mimo zemědělský sektor.



Tabulka 9: Přehled zemědělských podnikatelů, kteří v rámci projektu diverzifikovali svou činnost

Výzva	Fiche	Název žadatele	Název projektu	Požadovaná dotace	Proplacená dotace
2	3	Václav Jedlička	Ubytování pro agroturistiku	876 716	836 845
3	3	Robert Mišovský	Jízdárna na ekofarmě Sorkov	1 199 875	1 198 281
3	3	Marek Babuška	Stavební úpravy Manský Dvůr, Budova "E"-přestavba stodoly na sportovní zařízení	1 199 404	1 199 404
5	2	Ing.Petr Potůček	Oprávérenská dílna zemědělské techniky	799 995	Probíhá kontrola ŽoP

Podpora pomohla k diverzifikaci zemědělské činnosti čtyř žadatelů.

4.1.3 Odpověď na hodnotící otázku

Malým objemem finančních prostředků nejsou dotace poskytované prostřednictvím metody LEADER předurčeny k výrazným změnám v zaměstnanosti v regionu nebo změně struktury hospodářství.

V procesu implementace SPL bylo vytvořeno 7 nových pracovních míst a došlo k udržení stávající zaměstnanosti. Podpora EU v rámci metody LEADER přispěla k diverzifikaci hospodářství pěti projekty, kdy došlo k rozšíření živností žadatelů. Mimo výše uvedené projekty zemědělských podnikatelů byla rozšířena živnostenská činnost paní Alexandry Vaškové, která podala svůj projekt s názvem "Zateplení fasády a podkroví objektu č. p. 8, obec Pomezí nad Ohří" ve Výzvě č. 5 do Fiche 3.

4.2 Do jaké míry přispěla podpora k dosažení cílů místní strategie?

4.2.1 Jak napomohla podpora ke zkvalitnění života obyvatel v sídlech? (cíl – Atraktivní a dostupná obec)

V rámci SPL je zkvalitnění života obyvatel podmíněno stavem dopravní a technické infrastruktury. „Vybudování dopravní a technické infrastruktury sídel je podmiňujícím faktorem pro další rozvoj venkovských území, teprve následně lze realizovat projekty související s bydlením, občanskou vybaveností, službami a podnikatelskými provozy.“¹ Realizací projektů z Fiche 1 „Atraktivní a dostupná obec“ byla naplňována první část plánovaného dopadu strategie. Rozvoj občanské vybavenosti a služeb byl obsahem projektů podpořených z Fichí 5 a 6 „Aktivní venkov I.“ a „Aktivní venkov II.“ Podnikatelské provozy byly podporovány ve Fichi 2 „Pestrý venkov“ a ve Fichi 3 „Venkovský cestovní ruch“.

Podpora cílená na dopravní a technickou infrastrukturu nebo vzhled obcí byla v SPL avizovaná jako nejdůležitější. Za celé programovací období bylo v rámci Fiche 1 podpořeno 9 projektů s celkovou částkou dotace 6 574 027 Kč. Jedná se o 27 % celkově vyplacené dotace, což je největší podíl. Z grafu č. 2 je viditelné, že skutečně bylo proplaceno více finančních prostředků, než bylo plánováno.

Ve Fichi 5 a 6, kde se investovalo do občanského vybavení a služeb, bylo na MAS přijato celkem 59 projektů, z toho 33 jich bylo vybráno k podpoře a 32 (k 30. 6. 2015) proplaceno. U projektu Obce Krásná probíhala kontrola Žádosti o proplacení. Přestože Fiche 5 a 6 vznikly až po střednědobé

¹ Strategický plán LEADER pro období 2009 – 2013, str. 28



evaluaci v roce 2011 je o ně z hlediska počtu projektů největší zájem. Do 30. 6. 2015 bylo celkem proplaceno 32 projektů celkovou částkou 7 204 749 Kč, což činí 30 % proplacených peněz.

Projekty související s podnikatelskými provozy jsou hodnoceny v následující podotázce.

Díky podpoře EU distribuované prostřednictvím MAS 21 bylo opraveno 1,55 km komunikací III. a IV. třídy nebo veřejně přístupné účelové komunikace a bylo obnoveno nebo nově vytvořeno 3 998 m² veřejných prostranství.

4.2.2 Jak napomohla podpora k větší různorodosti venkovské ekonomiky? (cíl – Ekonomicky pestrý venkov)

V rámci Fichí 2 a 3, které podporují podnikatelské provozy, bylo na MAS podáno 11 projektů a k 30. 6. 2015 jich bylo 5 proplaceno v celkové výši 4 431 530 Kč. U projektu žadatele Ing. Petr Potůčka probíhá kontrola Žádosti o dotaci.

V pěti projektech došlo k rozšíření živnosti žadatelů, čímž došlo k rozrůznění venkovské ekonomiky.

4.2.3 Jak napomohla podpora k docenění a využití přírodního bohatství a kulturního dědictví území? (cíl – Podpora venkovského cestovního ruchu)

Projekty financované prostřednictvím Fiche 4 „Obnova a rozvoj kulturního dědictví“ řeší problémový okruh definovaný v SPL, „přírodní bohatství a kulturní dědictví území není doceněno a využito k udržitelným ekonomickým aktivitám ani jako nástroj pro vytvoření vztahu obyvatel k venkovskému prostoru.“² Na obnovu a zpřístupnění kulturního dědictví venkova bylo zaměřeno 19 projektů, které byly přijaty na MAS. Podporu získalo 14 projektu a k 30. 6. 2015 jich bylo proplaceno 13 v celkové výši 5 992 548 Kč. V SPL bylo do roku 2013 (2015) plánováno na danou Fichi 15 % z celkové alokace IV.1.2, ve skutečnosti bylo na obnovu kulturního dědictví vyčerpáno 25 %.

Prostřednictvím MAS 21 byly podpořeny především opravy malých kulturních památek (křížky, boží muka, mariánský sloup) a drobné opravy větších historických staveb (opravy omítek, výměny oken). Mezi zajímavé a záslužné projekty patří projekt Ing. Alice Dvořákové na Obnovu původní kolny v areálu zemědělské usedlosti Salajna č. p. 12, kdy byla vystavěná dřevěná kolna dle dochovaných historických materiálů původní stržené kolny. Nová stavba je vystavěna přesně na původním místě a tvarově i konstrukčně je nápodobou původní stavby. Původní dřevěná kolna bývala součástí hrázděného statku, který byl v roce 1958 prohlášen nemovitou kulturní památkou. Tato budova chátrala a v 80. letech minulého století byla stržena. Současnou snahou majitelů je uvést statek do původního stavu, tj. dostavět poslední dřevěnou stavbu - stodolu tak, aby došlo k obnovení klasického čtyřhranného uspořádání chebských hrázděných statků. V obnovené kolně je zřízena otevřená expozice historického zemědělského, domácího a řemeslného nářadí a náčiní. Dalším zajímavým projektem je aktivita Obce Drmoul „Obnova prostoru zaniklé vesnice Cech sv. Víta“. Předmětem projektu bylo obnažení a úprava základového zdiva původních obytných domů i obnova kamenného kříže. Obnova byla provedena podle dochované dokumentace. Realizací vznikla unikátní stálá venkovní expozice zaniklé vesnice Cech sv. Víta.

² Strategický plán LEADER pro období 2009 – 2013, str. 25



4.2.4 Odpověď na hodnotící otázku

Podpora poskytnutá prostřednictvím PRV značně přispěla k dosažení cílů místní strategie. Ve všech Fichích byl realizován aspoň jeden projekt. Opět je nutné připomenout, že malým objemem finančních prostředků není implementace SPL MAS 21 předurčena k výrazným změnám v rozvoji území.

Tabulka 10: Přehled Fichí naplňujících cíle SPL k 30. 6. 2015

	Podané žádosti na MAS				Proplacené projekty				Plán dle SPL
	ks	%	Kč (v tis.)	%	ks	%	Kč (v tis.)	%	%
Fiche 1	20	18	16 706	32	9	15	6 574	27	20
Fiche 2	4	4	3 595	7	0*	0	0	0	10
Fiche 3	7	6	7 735	15	5	8	4 432	18	25
Fiche 4	19	17	11 334	22	13*	22	5 993	25	15
Fiche 5	27	25	8 079	16	11*	19	4 415	18	20
Fiche 6	32	29	4 019	8	21	36	2 789	12	10
Celkem	109	100	51 468	100	59	100	24 203	100	100

Pozn: * probíhá kontrola Žádosti o proplacení

Ve Fichích 1, 4 a 6 bylo čerpáno více finančních prostředků než bylo plánováno při aktualizaci SPL. Naopak ve Fichích 2, 3 a 5 bylo využito méně finančních prostředků než bylo plánováno. Největší nedostatek je viditelný u Fiche 2 „Pestrý venkov“ zaměřené na diverzifikaci činností nezemědělské povahy a modernizaci zemědělských podniků. V rámci této Fiche byl úspěšně realizován pouze jeden projekt s názvem „Opravárenská dílna zemědělské techniky“, u kterého probíhá kontrola Žádosti o proplacení.

4.3 Do jaké míry byl implementován přístup LEADER?

4.3.1 Jak přispěla podpora k uplatnění inovačních postupů?

Inovaci lze definovat jako zavedení nové aktivity, nového řešení, změny a novinky, potom inovační přístup znamená např. zavedení nové technologie dosud v místě nepoužívané, uvedení na trh nového výrobku, zavedení nových metod. V důsledku inovací dochází také k úsporám práce a přírodních zdrojů. MAS 21 vnímá inovaci nejen jako uplatnění naprosto nových myšlenek a nápadů, ale také využití postupů, které jsou sice jinde v ČR nebo i na území MAS běžné, ale v dané lokalitě, nebo pro daného žadatele jsou nové. Inovativní prvky tak lze nalézt ve většině projektů realizovaných prostřednictvím MAS.

Mezi inovativní projekty lze zařadit:

- „Jízdárna na ekofarmě Sorkov“ (Robert Mišovský) - rekonstrukce objektu stodoly na jezdeckou halu. Účelem projektu bylo zvýšení a zkvalitnění nabídky služeb v oblasti volnočasových aktivit a cestovního ruchu v obci Libá.
- „Stavební úpravy MANSKÝ DVŮR, BUDOVA "E" - přestavba stodoly na sportovní zařízení“ (Ing. Marek Babuška CSc.) V rámci historického objektu Manský dvůr byla bývalá stodola upravena na celoročně využitelné sportovní zařízení pro rekreační sportovní aktivity ubytovaných hostů i návštěvníků.



- „Společnou cestou“ (Svazek obcí Kamenné Vrchy) – pořízení minibusu pro 9 osob včetně řidiče. Minibus využívají všechny členské obce mikroregionu a partneři projektu (DSH, MŠ, ZŠ, TJ Sokol, ...) pro přepravu v rámci mikroregionu i mimo něj. Minibus operativně převáží skupiny osob za různými zájmy podle harmonogramu sestaveného podle požadavků každého partnera projektu. Pravidelně je využíván pro převozy dětí do/ze školky, školní výlety, v odpoledních hodinách rozvoz/svoz dětí na zájmové kulturní a sportovní kroužky. Ve volných časových intervalech využití na turistické vyjíždky. O víkendu převozy na různé sportovní, kulturní a společenské akce. Jinak je minibus stále připraven pro živelné a jiné pohromy.
- „Stopovací zařízení a vybavení pro vytváření běžecké lyžařské stopy na území obce Lipová a Stará Voda“ (Život na Dyleň, z. s.) – před pořízením vybavení byly lyžařské stopy pouze prošlapávány jízdou lyžaře, buď členy spolku, nebo ojedinelými lyžaři. Pořízením zařízení došlo ke zkvalitnění a prodloužení tratí a především ke zpřístupnění příhraničního území pro aktivní trávení volného času. Cílem projektu bylo nabídnout obyvatelstvu ze širokého okolí možnost sportovního zimního vyžití, což se podařilo.
- „Jazyková laboratoř“ (Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně) – pořízení vybavení jazykové laboratoře individuálními boxy, výpočetní technikou, sluchátky a výukovými programy a tím rozšíření a zefektivnění činnosti spolku. Jazyková laboratoř není jinde na území MAS 21.

4.3.2 Jak přispěla podpora k realizaci projektů spolupráce MAS?

Ve strategickém dokumentu MAS 21 nebyla národní ani mezinárodní spolupráce nijak upřesněna nebo plánována. V průběhu implementace SPL bylo připraveno a na SZIF zaregistrováno 10 projektů spolupráce do opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce PRV. Dva z těchto projektů měly být realizovány ve spolupráci s MAS ze zahraničí, jednalo se o projekty mezinárodní spolupráce. Ostatní projekty byly plánovány pouze za součinnosti MAS z České republiky. Ve většině projektů bylo partnerství vytvářeno alespoň s jednou místní akční skupinou Karlovarského kraje. MAS 21 byla koordinační místní akční skupinou (KMAS) ve třech připravovaných projektech, z nichž pouze jeden byl vybrán k podpoře (Kraj živých vod).




Tabulka 11: Přehled zaregistrovaných projektů spolupráce 2009 -2015

Registrační číslo	Název projektu	KMAS	PMAS*
09/008/4210a/341/000036	Kraj živých vod	MAS 21, o. p. s.	1
10/010/4210a/341/000019	Obnovujeme společně zeleň v regionu	MAS 21, o. p. s.	1
10/010/4210a/341/000021	Společně užívejme a vzdělávejme	MAS 21, o. p. s.	1
10/010/4210a/341/000036	Cesty zámeckých pánů	Náš region	1
11/013/4210b/120/000033	Metoda LEADER budoucnost venkova	Přemyslovské střední Čechy o. p. s.	10
12/015/4210a/341/000004	Kraj živých vod II.	Náš region	2
12/017/4210a/341/000064	Vzdělaný venkovan	MAS Sokolovsko o. p. s.	2
12/017/4210b/232/000066	To co frčí v pohraničí	MAS Český les, z. s.	3
13/019/4210a/341/000002	Pojďme si hrát	MAS Krušné hory, o. p. s.	1
15/022/4210a/341/000013	Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje	MAS Sokolovsko o. p. s.	6

Pozn. * PMAS – počet partnerských MAS

Úspěšnost předkládaných projektů je pouze 40 %. SZIF nevybral k podpoře 6 z 10 připravovaných projektů.

Graf 3: Úspěšnost projektů spolupráce, ve kterých byla zapojena MAS 21, o. p. s. (2009 - 2015)

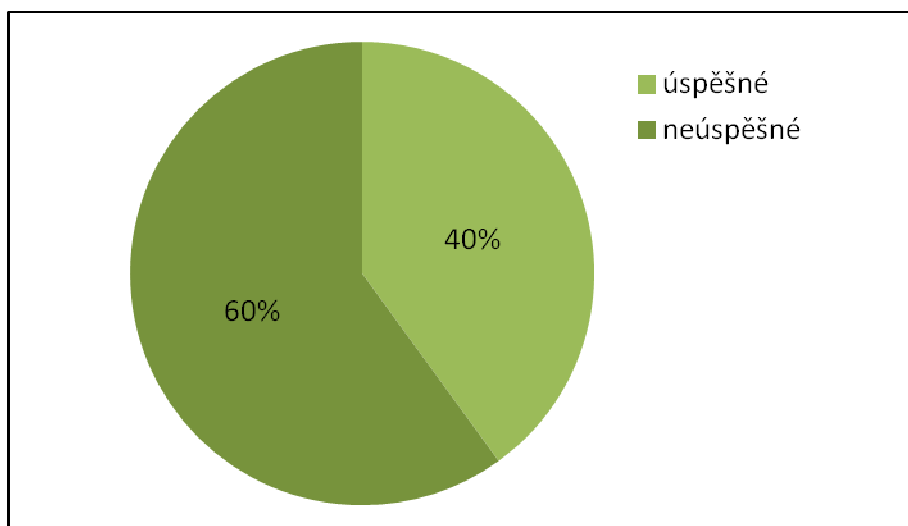

Mezi úspěšně zrealizované projekty patří:

- „Kraj živých vod“ – KMAS – MAS 21, o. p. s.



PMAS – Náš region

Projekt byl zaměřený na ochranu a rozvoj kulturního dědictví, tematicky spjatého s vodou. V rámci projektu došlo k revitalizaci řady venkovských prvků (vodní nádrže, kašny, prameny), vybudování tematických stezek cestovního ruchu, tvorba studií vztahující se k přípravě budoucích projektů.

- „Cesty zámeckých pánů“ – KMAS – Náš region
PMAS – MAS 21, o. p. s.

Cílem projektu bylo zmapování historických krajinných struktur, realizace obnovy Bečovské botanické zahrady, spolupráce středních škol, workshopy, studentský workcamp a exkurze na území obou MAS.

- „Kraj živých vod II.“ – KMAS – Náš region
PMAS – MAS 21, o. p. s.

Projekt logicky navazuje na předchozí projekty a iniciativy jak jednotlivých partnerských MAS, tak především na vzájemnou spolupráci při společném rozvoji území. Využívá podklady vytvořené v projektu „Kraj živých vod“. Cílem projektu byla obnova místního fenoménu minerálních pramenů, vyznačení naučné stezky, vybudování volnočasového areálu, informačních tabulí na železničních stanicích a další aktivity.

- „Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje“
KMAS – MAS Sokolovsko o. p. s.
PMAS – MAS21, o. p. s., MAS Český les, z.s., MAS Kraj živých vod, z. s., MAS Krušné hory, o. p. s., MAS Radbuza, z.s., MAS Zlatá cesta, o. p. s.

Předmětem projektu bylo vypracování metodiky na téma monitoring a evaluace. Velkým přínosem projektu byl přenos zkušeností nejen mezi MAS vybranými a nevybranými, ale i mezi vybranými navzájem.

Tabulka 12: Přehled realizovaných projektů spolupráce IV.2.1 (2009 - 2015) k 30. 6. 2015

Rok	Kolo PRV	Název projektu	Proplaceno (v Kč)	
			Celková částka	MAS 21
2009	8.	Kraj živých vod	4 145 728	3 023 728
2010	10.	Cesty zámeckých pánů	4 910 612	420 612
2012	15.	Kraj živých vod II.	3 096 449	1 080 472
2015	22.	Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje	-	-

Přestože oblast spolupráce mezi MAS na národní a mezinárodní úrovni nebyla v rámci SPL řešena, lze konstatovat, že MAS 21 se do daného opatření zapojila. Realizované projekty umožnily finanční podporu na zmapování, obnovu nebo zviditelnění drobných pramenů minerálek, tedy specifika území MAS 21 a MAS Náš region.

4.3.3 Přispěla podpora k zapojení MAS do sítí místních partnerství?

Pracovníci MAS 21 se po celou dobu implementace SPL účastnili setkání a aktivit místních partnerství.



Setkávání aktérů rozvoje venkova

Pravidelně se účastnili akcí a setkání, která probíhala za účasti velkého počtu zástupců MAS z různých regionů, ale také zástupců ostatních subjektů, kteří mají bohaté zkušenosti s rozvojem venkovských oblastí:

- LEADERfest, na němž jsme se účastnili v roce 2011
- Výstava Země živitelka, kde jsme propagovaly naše území v letech 2012 - 2014
- Výstava Má vlast, která proběhla s naší účastí v letech 2013 - 2014
- Valné hromady NS MAS, kterých se účastníme od roku 2012 každoročně
- Národní konference Venkov, na níž jsme se doposud účastnili v letech 2009, 2010, 2012 a 2014

Setkávání v rámci Krajské sítě NS MAS Karlovarského kraje

Náměty pro řešení problémů byly získávány na pravidelných jednáních Krajské sítě NS MAS Karlovarského kraje. Těchto setkání se účastnilo MAS Sokolovsko, MAS Kraj živých vod, MAS Krušné hory západ, MAS Vladař a MAS 21. S ohledem na společné charakteristiky zúčastněných MAS se zde řešily podobné problémy a MAS si navzájem vyměňovaly zkušenosti a postřehy při jejich řešení.

Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z. s.

V prosinci 2014 vzniklo Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z. s.. Nezisková organizace byla založena třemi místními akčními skupinami za účelem intenzivnější podpory regionálního rozvoje karlovarského regionu a napomáhání všeobecnému rozvoji a vzestupu venkovských oblastí Karlovarského kraje v duchu společenské, kulturní, sportovní a environmentální osvěty. Dále za účelem přispívání k udržení a ochraně kulturně-historické podoby obcí v návaznosti na tradice a potřeby místních občanů a v souladu s krajinným rázem regionu.

MAS zapojené do Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.

- MAS Vladař o.p.s.
- MAS Sokolovsko o. p. s.
- MAS 21, o. p. s.

Více informací je možné najít na internetových stránkách sdružení <http://ksmas-karlovarsko.cz/>.

Setkávání v rámci individuálních návštěv

Vedle výměny zkušeností v rámci Krajské sítě NS MAS Karlovarského kraje a Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s. se pracovníci MAS účastnili exkurzí do MAS v okolních regionech. V letech 2007 – 2013 se uskutečnila návštěva MAS Český Západ – Místní partnerství a MAS Moravský kras. Obě tyto MAS patří mezi úspěšné a exkurze management MAS 21 obohatily o zkušenosti a inspiraci pro další práci.

Společné hodnocení činnosti partnerských MAS

Dalším zdrojem pro výměnu zkušeností a inspirace byla vzájemná hodnocení činnosti mezi MAS 21 a MAS Sokolovsko. V letech 2011 a 2012 proběhlo vzájemné střednědobé hodnocení. Na základě výsledků šetření v místech pracovišť byly vypracovány závěrečné zprávy, ve kterých si navzájem obě



MAS vyhodnotily své poznatky a doporučily možnosti pro zlepšení. Závěry z těchto doporučení byly postupně zapracovány do další činnosti MAS 21.

4.3.4 Odpověď na hodnotící otázku

Přístup LEADER (Liaison Entre Actions Développement de l'Économie Rurale neboli Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku) je v České republice implementován prostřednictvím místních akčních skupin, tedy společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy.

Obrázek 1: Charakteristiky přístupu LEADER



Zdroj: UE, Kummissjoni Ewropea. *Přístup Leader: základní příručka*. Lucemburk: EUR-OP, 2006. ISBN 9279020404.

- Partnerství veřejného a soukromého sektoru

Tento parametr je základním kamenem organizace MAS 21, kdy veškeré správní, rozhodovací, výkonné a kontrolní orgány jsou tvořeny zástupci jak soukromé, tak veřejné sféry. V každém orgánu je více než polovina členů ze soukromého sektoru.

- Místní rozvojová strategie

Strategický plán LEADER byl zpracován projektovým týmem MAS za aktivní účasti veřejnosti (workshopy, veřejná projednání, individuální rozhovory). V rámci dokumentu byla vytvořena SWOT analýza, ze které vyplynuly problémové okruhy rozvoje území. Prostřednictvím SPL byla finanční podpora EU směřována na projekty, které přispěly ke zlepšení situace v regionu.

- Přístup zdola nahoru

SPL byl veřejně projednáván (workshopy, veřejná projednání, individuální rozhovory). V rámci střednědobého hodnocení byly pro úpravy dokumentu využity poznatky z dotazníkového šetření, individuálních konzultací atd. O obsahu dokumentu rozhodovali lidé žijící a pracující v území, kteří znali jeho potřeby a nedostatky.



- Integrované a vícesektorové akce

Víceodvětvový přístup nebyl formálně žadateli deklarován. Důvod je možné spatřit v chybném nastavení Fichí, kdy nebyl kladen dostatečný tlak na spolupráci subjektů z různých odvětví hospodářství. Za víceodvětvový projekt lze považovat pořízení minibusu v rámci projektu „Společnou cestou“ (Svazek obcí Kamenné Vrchy), kdy byly partnery subjekty z veřejné i soukromé sféry (Kirch a Kirch s.r.o., ZD Křižovatka, MŠ Nový Kostel, SDH Křižovatka, města a obce Svazku obcí Kamenné vrchy).

- Inovace

Z pohledu MAS bylo průběhu implementace SPL podpořeno mnoho inovativních projektů, nicméně za reálně inovativní lze považovat 5 projektů. Viz. 4.3.1

- Síťování

MAS 21 se účastnila seminářů, konferencí, akcí pořádaných za hojně účasti MAS z celé České republiky. Viz. 4.3.3.

- Spolupráce

MAS 21 úspěšně realizovala 4 projekty spolupráce s MAS v rámci České republiky. Viz. 4.3.2

Všechny rysy přístupu LEADER byly splněny. Podpora na území MAS výrazně napomohla implementaci přístupu LEADER.

4.4 Do jaké míry přispěla implementace přístupu LEADER ke zlepšení místní správy?

4.4.1 Jak podpora zlepšila možnost setkávání místních obyvatel?


Prostřednictvím finanční podpory byla obnovena 4 veřejná prostranství, 1 historický dům v Dolním Žandově, který slouží k setkávání místních obyvatel, 2 společenské domy a bylo vybaveno zázemí 3 spolků technikou, která se užívá při setkávání obyvatel. Celkem bylo setkávání místních obyvatel podpořeno částkou 2 884 203 Kč.

4.4.2 Byla podpora rozložena rovnoměrně do celého území?

Na území 10 obcí nebyl zrealizován ani jeden projekt financovaný v rámci implementace SPL. Nejúspěšnější byly projekty z Dolního Žandova (9), Mariánských Lázní a Krásné (6), Plesné a Třech Seker (5). Projekty jsou v rámci území MAS rovnoměrně rozprostřeny. Rozložení úspěšně zrealizovaných projektů na území MAS 21 je viditelné na následující mapě.



Obrázek 2: Rozložení realizovaných projektů na území MAS 21

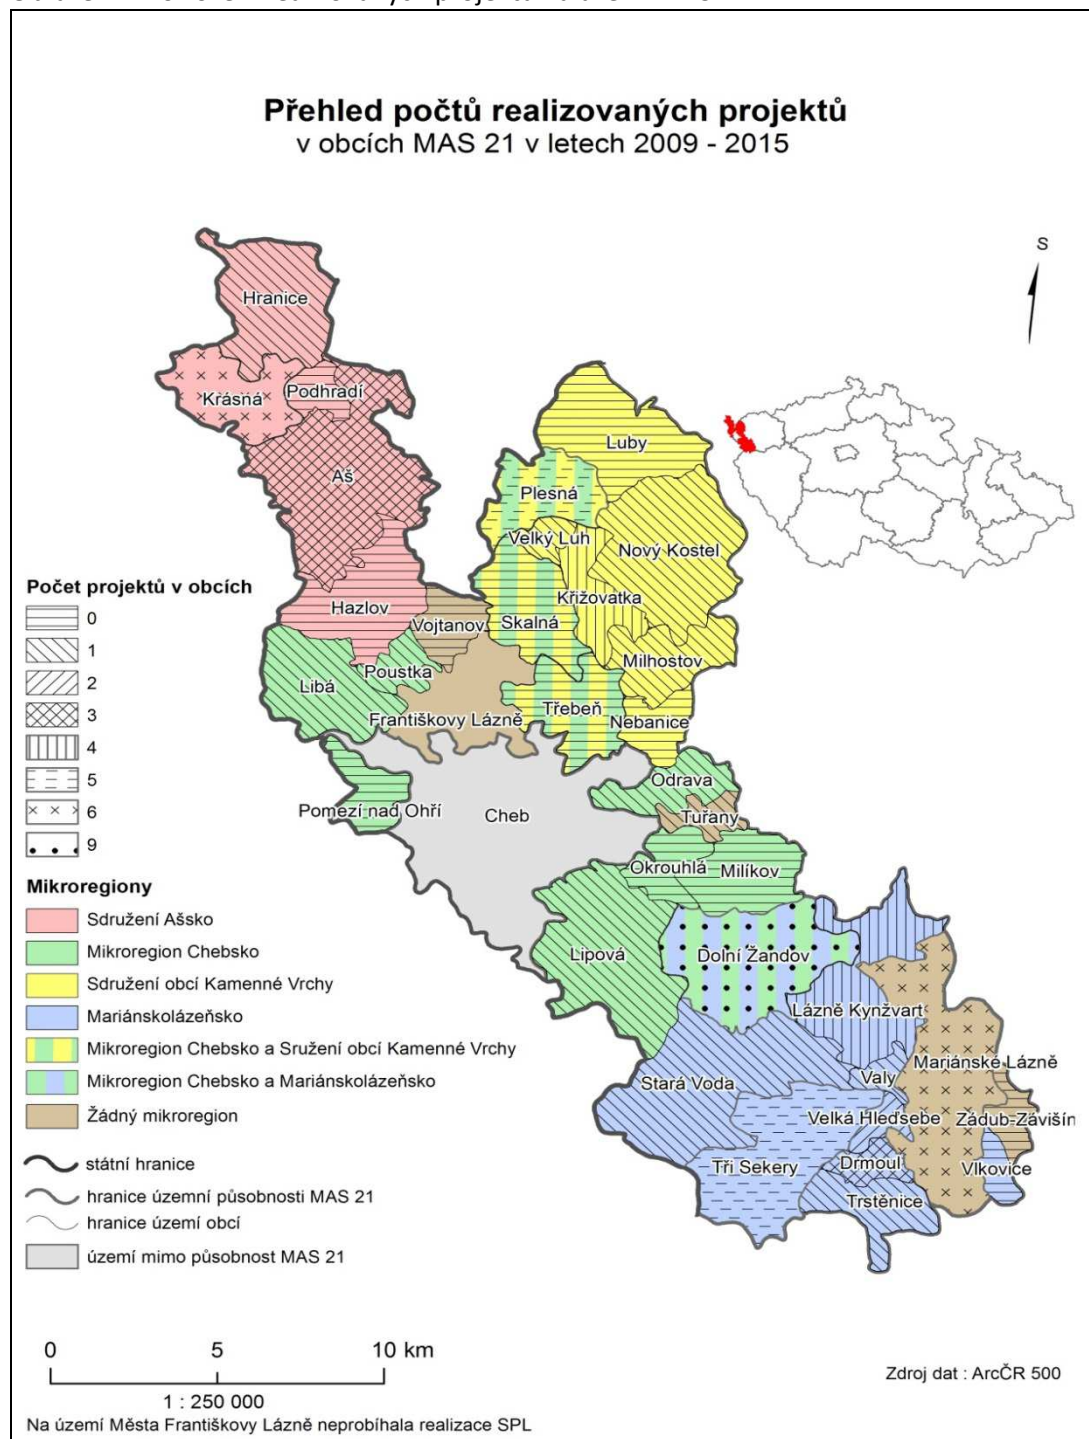

4.4.3 Přispěla podpora k iniciaci dalších (případně navazujících) aktivit?

Více než polovina respondentů uvedla, že díky realizaci jejich projektu se jim podařilo navázat dlouhodobou spoluprací s dalšími subjekty. Dále je jako pozitivní navazující aktivita zmiňována další etapa projektu nebo rozšíření nabídky poskytovaných služeb. Obecně lze konstatovat, že podpora konkrétních, především podnikatelských, projektů vede k aktivizaci příjemce dotace i jeho okolí.

4.4.4 Odpověď na hodnotící otázku

Mezi projekty pozitivně ovlivňující místní správu lze zařadit projekty na zvýšení bezpečnosti v obcích (rozhlasový systém a rychlostní radary) nebo projekty zaměřené na obnovu budov a vnitřních prostor



obecních úřadů. Mezi obecně prospěšné projekty jsou zařazeny i nákupy minibusů, které mimo jiné slouží k převozu dětí do mateřských školek.

Tabulka 13: Přehled projektů přispívajících ke kvalitní místní správě k 30. 6. 2015

Výzva	Fiche	Název žadatele	Název projektu	Požadovaná dotace	Proplacená dotace
5	1	Svazek obcí Kamenné Vrchy	Bezpečné silnice	400 500	400 500
1	1	Svazek obcí Kamenné Vrchy	Rozhlasový systém pro Kamenné Vrchy	1 458 000	1 458 000
4	5	Obec Tuřany	Obnova budovy Obecního úřadu Tuřany	60 000	53 495
4	5	Obec Dolní Žandov	Rekonstrukce Obecního úřadu v Dolním Žandově	162 900	162 900
6	5	Město Plesná	Zasedací místnost	262 240	262 240
6	5	Svazek obcí Kamenné Vrchy	Společnou cestou	435 000	435 000
6	5	Obec Krásná	Pořízení školního autobusu	435 500	Kontrola ŽoP

Implementace přístupu LEADER velmi výrazně přispěla ke zlepšení místní správy. Díky přístupu LEADER má veřejnost možnost zapojit se do plánování investic v obci, a ovlivnit tak kvalitu života v místě bydliště.

4.5 Byla aktivita MAS v procesu implementace SPL dostatečná?

4.5.1 Byla propagace jednotlivých Výzev dostatečná?

Každá Výzva byla propagována na webových stránkách MAS a v regionálním periodiku (Chebský deník), zároveň byl na partnery a členské obce rozeslán informační e-mail. Z dotazníku vyplynulo, že starostové členských obcí byly výraznými propagátory jednotlivých Výzev. Hojně byly využívány i internetové stránky MAS.

Nejčastěji využívaným zdrojem informací o MAS jsou webové stránky a komunikace s manažery mikroregionů a starosty členských obcí. Je nutné zintenzivnit propagaci MAS a jejich aktivit.

4.5.2 Byly dodržovány administrativní postupy stanovené v SPL?

Administrativní postupy uvedené v SPL (registrace projektů, způsob výběru projektů, realizační část, archivace, monitoring a evaluace) byly v průběhu implementačního období aktualizovány dle praxe.

Obecně lze konstatovat, že byly dodrženy všechny postupy s výjimkou monitoringu. Monitorování naplňování cílů SPL byl pověřen monitorovací výbor. Monitoring byl prováděn dle harmonogramu, tak jak je uvedeno v implementační části SPL, neprováděl jej však celý monitorovací výbor, ale pouze 2 ze 3 členů. Z výsledků monitoringu byla vždy vypracována zpráva, která byla předložena správní radě, dozorčí radě a programovému výboru.



4.5.3 Naplnila implementace SPL předpokládané dopady SPL?

V rámci SPL byly předpokládané následující dopady realizace SPL a jeho přínosy pro dané území v dlouhodobější perspektivě:

- Vybudování dopravní a technické infrastruktury sídel je podmiňujícím faktorem pro další rozvoj venkovských území, teprve následně lze realizovat projekty související s bydlením, občanskou vybaveností, službami a podnikatelskými provozny.
- Diverzifikace činností nezemědělské povahy pomůže snížit ekonomickou závislost místního hospodářství na podnikání v zemědělství, nastartuje konkrétní formy spolupráce podnikatelů se subjekty veřejné správy a nestátními neziskovými organizacemi.
- Modernizace zemědělských podniků přispěje ke stabilitě venkovského prostoru při podpoře zaměstnanosti.
- Zkvalitnění občanského vybavení a služeb přispěje k rozvoji volnočasových aktivit místních obyvatel a k posílení lokální identity a mezilidských vztahů
- Obnovené kulturní dědictví venkova

Projekty realizované prostřednictvím podpory MAS 21 naplňovaly výše uvedené dopady SPL, z důvodu nízkých finančních prostředků však neměly možnost výrazně ovlivnit stav hospodářství, technické infrastruktury, občanského vybavení nebo služeb na území MAS 21.

4.5.4 Odpověď na hodnotící otázku

Pracovníci MAS pracovali v souladu s postupy uvedenými v implementační části SPL. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že veřejnost nemá příliš velké povědomí o existenci a poslání MAS 21. Vnější komunikace MAS nebyla v SPL přesně popsána, a proto v této oblasti má MAS 21 nedostatky.



5. Závěry a doporučení

Podpora EU poskytovaná prostřednictvím projektů konečných žadatelů MAS 21 je vynakládána účelně a cíleně, prospívá k rozvoji a obnově regionu v souladu s cíli a prioritami stanovenými v SPL.

5.1 Soulad použitých monitorovacích indikátorů se sledovanými prioritami a cíli, rovnováha mezi Fichemi dle SPL

Tabulka 14: Soulad monitorovacích indikátorů s cíli SPL

Monitorovací indikátor		Cíl SPL
1	Podpořené projekty v rámci SPL (počet)	Atraktivní a dostupná obec Ekonomicky pestrý venkov Podpora venkovského cestovního ruchu Aktivní venkov
2	Zrekonstruované nebo nové komunikace III. a IV. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace (km)	Atraktivní a dostupná obec
3	Obnovené nebo nově vytvořené veřejné prostranství (m ²)	Atraktivní a dostupná obec
4	Zrekonstruovaná nebo vybudovaná vodohospodářská infrastruktura (počet)	Atraktivní a dostupná obec
5	Pořízené technologie (technologie – výrobní postup, technické zařízení), (počet)	Ekonomicky pestrý venkov
6	Zrekonstruované/nově vzniklé objekty (počet)	Ekonomicky pestrý venkov
7	Zavedení nových produktů nebo služeb (počet)	Aktivní venkov
8	Nová ubytovací lůžka (počet)	Podpora venkovského cestovního ruchu
9	Obnovené nebo zhodnocené kulturní dědictví (počet)	Podpora venkovského cestovního ruchu
10	Vytvořené/obnovené/rozšířené tematické stezky (km)	Podpora venkovského cestovního ruchu

Aktualizované monitorovací indikátory jsou v souladu s prioritami a cíli vytýčenými v SPL. Jak již bylo uvedeno v předcházejícím textu Fiche vychází z cílů SPL, proto projekty v nich realizované přispívají k dosažení cílů SPL.

5.2 Míra dosažení cílů

Metoda LEADER je postavena na finančně méně náročných projektech, které jednotlivě nemají významný vliv na stav hospodářství, technické infrastruktury, občanského vybavení, služeb, památek, nebo náladu ve společnosti. MAS 21 přerozdělila v uplynulém programovacím období finanční částku 24 202 854,- Kč na projekty konečných žadatelů, ze které bylo podpořeno 59 projektů. V průměru tak na každý rok realizace SPL tak přichází necelých 9 projektů v hodnotě 3,5 mil. Kč. Z uvedeného



vyplývá, že i když projekty přispívají k naplnění cílů SPL, není možné, aby bylo dosaženo stavu vytyčeného v dopadu realizace.

5.3 Doporučení na základě výsledku hodnocení

Pro další činnost MAS 21 o. p. s. je vhodné zaměřit se následující aktivity:

- Propagace činnosti MAS navenek – facebook
- Intenzivnější spolupráce s členskými mikroregiony na rozvoji území
- Více se zapojovat do veřejných aktivit, což napomůže propagovat činnost MAS u místních obyvatel a podnikatelských subjektů



Přílohy



Přílohy

Příloha 1: Přehled partnerů mezi roky 2009 a 2015

	2009	2011	2015
1	Mariánskolázeňsko	Mariánskolázeňsko	Mariánskolázeňsko
2	Sdružení obcí a firem - Chebská pánev	Sdružení obcí a firem - Chebská pánev	Sdružení Ašsko
3	Sdružení Ašsko	Sdružení Ašsko	Svazek obcí Kamenné Vrchy
4	Svazek obcí Kamenné Vrchy	Svazek obcí Kamenné Vrchy	Mikroregion Chebsko
5	Mikroregion Chebsko	Mikroregion Chebsko	Obec Vojtanov
6	Obec Vojtanov	Obec Vojtanov	Město Mariánské Lázně
7	Město Mariánské Lázně	Město Mariánské Lázně	Obec Zádub - Závěšín
8	Zahradní a parková, spol s r. o.	Zahradní a parková, spol s r. o.	Obec Tuřany
9	Lázně Františkovy Lázně, a.s.	Lázně Františkovy Lázně, a.s.	Zahradní a parková, spol s r. o.
10	Zemědělské družstvo "ROZVOJ"	Zemědělské družstvo "ROZVOJ"	Lázně Františkovy Lázně, a.s.
11	SPORT - SERVIS ML, s. r. o.	Ing. Petr Potůček	Zemědělské družstvo "ROZVOJ"
12	ZÁPADNÍ STAVEBNÍ DL a.s.	TECLAN CZ s. r. o.	Ing. Petr Potůček
13	Ing. Petr Potůček	Joker o. s.	TECLAN CZ s. r. o.
14	TECLAN CZ s. r. o.	Ing. Marek Babuška	Joker o. s.
15	Joker o. s.	Okresní hospodářská komora Cheb	Ing. Marek Babuška
16	Ing. Marek Babuška	Městské muzeum Mariánské Lázně	Okresní hospodářská komora Cheb (KHKKK)
17	Okresní hospodářská komora Cheb	ZO ČSOP Kladská	Městské muzeum Mariánské Lázně
18			ZO ČSOP Kladská
19			Antonín Podvalský
20			Jezdecký klub Krásná
21			ZD Křižovatka
22			TJ Sokol Lázně Kynžvart
23			Centrum pro volný čas
24			FC Jiskra Hazlov
25			TJ Sokol Mariánské Lázně
26			Rybářská společnost Libá

27			Svaz tělesně postižených v České republice - Drmoul
28			Náboženská obec Církve československé husitské v Mariánských Lázních
29			TJ Jiskra - Skl Union Hranice
30			Živá studánka o. s.

Pozn: **červeně označení partneři** - ukončili spolupráci s MAS 21. o. p. s.

Zeleně označení partneři – noví partneři MAS 21, o. p. s.



Příloha 2: Přehled projektů podaných na MAS k 30. 6. 2015

Výzva	Fiche	Název žadatele	Název projektu	Podpis dohody	Dotace (Kč)		Poznámka
					Požadovaná	Proplacená	
1	1	Město Luby	Parkoviště u zdravotního střediska	-	1 483 602	-	Ukončena administrace MAS
1	1	Obec Drmoul	Obnova veřejného prostranství v okolí kaple sv. Josefa v obci Drmoul	19.4.2010	760 698	750 130	
1	1	Svazek obcí Kamenné Vrchy	Rozhlasový systém pro Kamenné Vrchy	9.4.2010	1 458 000	1 458 000	
1	4	Mariánskolázeňsko	Kulturní dědictví Mariánskolázeňska	-	431 100	-	Ukončena administrace SZIF
1	4	Obec Tři Sekery	Obnova tří křížků ve Třech Sekerách	19.4.2010	172 634	172 634	
1	4	Obec Dolní Žandov	Stavební obnova historicky významného domu č.p.40	19.4.2010	364 461	364 461	
1	4	Město Lázně Kynžvart	Obnova Mariánského sloupu	19.4.2010	216 000	216 000	
1	4	Město Plesná	Oprava vnitřních omítek a maleb kněžiště kostela v Lomničce u Plesné, II. etapa	21.4.2010	721 234	644 165	
2	1	Město Lázně Kynžvart	Obnova prostranství v Lázních Kynžvart	10.12.2010	676 066	411 531	
2	1	Město Luby	Parkoviště u zdravotního střediska	-	1 425 717	-	Projekt neschválen SZIF
2	1	Obec Milhostov	Obnova komunikace v Milhostově	9.12.2010	953 333	872 270	
2	3	Václav Jedlička	Ubytování pro agroturistiku	22.12.2010	876 716	836 845	
2	4	Obec Tři Sekery	Obnova tří křížků ve Třech Sekerách II	10.12.2010	404 491	379 852	
2	4	Obec Drmoul	Obnova prostoru zaniklé vesnice Cech sv. Víta	10.12.2010	556 845	556 845	
2	4	Obec Odrava	Oprava sochy „Boží muka“ v obci Odrava - Dobroše	17.12.2010	54 000	54 000	
2	4	Obec Poustka	Obnova vnitřních a vnějších omítek kapličky v Poustce včetně úpravy okolí	16.12.2010	175 491	175 491	
2	4	Obec Dolní Žandov	Obnova hřbitova v obci Dolní Žandov	10.12.2010	242 550	240 176	



2	4	Obec Trstěnice	Obnova hřbitova v obci Trstěnice	-	307 800	-	Žadatel nepodepsal dohodu
3	2	ZD Křižovatka	Mošárna a krmný, řezací, míchací stroj	-	905 000	-	Ukončena administrace SZIF
3	2	E - PLACE.CZ Limited	Peletovací lis s rozdužovačem	-	816 450	-	Ukončena administrace MAS
3	2	Václav Jedlička	Modernizace výrobního zařízení ve stávajícím objektu - výroba tvarovaných biopaliv	23.11.2011	1 073 226	-	Příjemce odstoupil před ŽoP
3	3	Terezia Kletečková	Rekonstrukce objektu na malokapacitní zařízení a zařízení půjčovny sportovních potřeb	5.12.2011	1 200 000	-	Příjemce odstoupil před ŽoP
3	3	Robert Mišovský	Jízdárna na ekofarmě Sorkov	1.12.2011	1 199 875	1 198 281	
3	3	Ing.Marek Babuška, CSc.	Stavební úpravy Manský Dvůr, Budova "E"- přestavba stodoly na sportovní zařízení	24.11.2011	1 199 404	1 199 404	
4	1	Obec Dolní Žandov	Revitalizace-obnova veřejného prostranství v obci Dolní Žandov	2.8.2012	939 159	804 387	
4	1	Město Lázně Kynžvart	Obnova mostku na místní komunikaci v ulici Potoční	-	431 811	-	Nevybrán k podpoře MAS
4	1	Obec Křižovatka	Obnova veřejného prostranství v obci Křižovatka	-	1 800 000	-	Stažení ŽoD žadatelem před výběrem MAS
4	1	Obec Tři Sekery	Stavební úpravy místní komunikace Tři Sekery - trasa "C"	2.8.2012	1 800 000	1 542 427	
4	1	Obec Drmoul	Obnova prostranství v okolí kaple sv. Josefa	-	233 100	-	Nevybrán k podpoře MAS



4	1	Obec Valy	Inženýrské sítě a komunikace Valy	-	1 540 827	-	Stažení ŽoD žadatelem před výběrem MAS
4	1	Obec Krásná	Rekonstrukce komunikace v místní části Kamenná	22.8.2012	1 014 075	999 734	
4	1	Město Plesná	Obnova a umístění nových informačních a orientačních tabulí a plakátovacích ploch	-	161 017	-	Nevybrán k podpoře MAS
4	1	Obec Hazlov	Obnova místní komunikace v obci Hazlov a pořízení komunální úklidové linky	-	868 804	-	Nevybrán k podpoře MAS
4	1	Obec Tuřany	Veřejný rozhlas v obci Tuřany	-	108 000	-	Nevybrán k podpoře MAS
4	4	Obec Dolní Žandov	Stavební obnova historicky významného domu č.p. 40 II	2.8.2012	143 100	143 098	
4	4	Ing. Alice Dvořáková	Obnova dřevěné kůlny na statku Salajna čp. 12 se zřízením výstavní expozice	-	1 149 670	-	Nevybrán k podpoře MAS
4	4	Institut pro trvale udržitelný rozvoj	Studie obnovy a využití kulturního dědictví Mariánskolázeňska	-	78 300	-	Nevybrán k podpoře MAS
4	4	Václav Hupka	Studie obnovy a využití kulturního dědictví venkova - Areál bývalého zámku v Kopaninách	22.8.2012	315 000	315 000	
4	5	Město Lázně Kynžvart	Obnova dětského hřiště u mateřské školy v Lázních Kynžvartu	2.8.2012	378 000	336 832	
4	5	Obec Drmoul	Rekonstrukce kulturního domu Drmoul	7.8.2012	1 800 000	1 800 000	
4	5	Obec Velký Luh	Modernizace zázemí pro kulturní a společenské akce	8.8.2012	238 447	238 447	
4	5	Obec Velká Hleďsebe	Vybavení tělocvičny ve Velké Hleďsebi	7.8.2012	409 950	409 941	
4	5	Obec Dolní Žandov	Rekonstrukce Obecního úřadu v Dolním Žandově	2.8.2012	162 900	162 900	
4	5	Mariánskolázeňsko	Pořízení technického zázemí pro kulturní a spolkovou činnost	2.8.2012	291 600	249 750	
4	5	Obec Tuřany	Obnova budovy Obecního úřadu Tuřany	16.8.2012	60 000	53 495	
4	6	Mariánskolázeňsko, o.p.s.	Vybavení pro rozvoj kulturní činnosti	2.8.2012	154 800	154 800	



4	6	Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko STOPA Mar.Lázně	Místo pro setkávání v přírodě	20.8.2012	72 000	68 397	
4	6	Jezdecký klub Krásná	Rekonstrukce kruhové jízdárny a pořízení vybavení pro jezdecký výcvik	22.8.2012	175 500	175 500	
4	6	SDH Krásná	Vybudování materiálně technického zázemí mladých hasičů v Krásné	22.8.2012	180 000	172 883	
4	6	Karel Ašler	Pořízení zvukové a světelné techniky pro činnost o.s. Karel Ašler	22.8.2012	129 240	129 240	
5	1	Svazek obcí Kamenné Vrchy	Bezpečné silnice	27.8.2013	400 500	400 500	
5	1	Město Skalná	Úprava hřbitova města Skalná	-	294 680	-	Nevybrán k podpoře MAS
5	1	Obec Drmoul	Obnova veřejného prostranství	-	206 100	-	Nevybrán k podpoře MAS
5	1	Obec Dolní Žandov	Obnova veřejného prostranství v Úbočí	22.8.2013	150 930	145 918	
5	2	Ing-Petr Potůček	Opravárenská dílna zemědělské techniky	28.8.2013	799 995		Probíhá kontrola ŽoP
5	3	KIRCH a KIRCH s.r.o.	Malokapacitní ubytovací zařízení	27.8.2013	1 197 000	1 197 000	
5	3	KARTARENA s.r.o.	KARTARENA YPSILONKA - prodloužení tratě	-	1 000 000	-	Nevybrán k podpoře MAS
5	3	Alexandra Vašková	Zateplení fasády a podkroví objektu č. p. 8, obec Pomezí nad Ohří, část Tůně	19.9.2013	1 061 731		Probíhá kontrola ŽoP
5	4	Ing.Alice Dvořáková	Obnova původní kolny v areálu zemědělské usedlosti Salajna č. p.	11.9.2013	1 004 897	1 004 897	
5	4	Obec Dolní Žandov	Stavební obnova historicky významného domu č. p. 40 III.	22.8.2013	172 350	172 350	
5	4	Obec Hazlov	Studie obnovy Horní hospody a zámeckého parku	-	47 475	-	Projekt neschválen SZIF
5	4	Obec Velká Hleďsebe	Obnova hřbitova ve Velké Hleďsebi	22.8.2013	1 071 180	742 709	
5	5	Město Plesná	Tělocvična Plesná	27.8.2013	420 678	413 385	



5	5	Město Lázně Kynžvart	Obnova vchodových dveří na Městském úřadě	-	114 300	-	Nevybrán k podpoře MAS
5	5	Obec Drmoul	Rozšíření dětského hřiště v obci Drmoul	-	273 600	-	Nevybrán k podpoře MAS
5	5	Obec Valy	Obnova obecního úřadu ve Valech	-	119 700	-	Nevybrán k podpoře MAS
5	5	Obec Velká Hleďsebe	Obnova fasády na budově základní školy	-	270 450	-	Nevybrán k podpoře MAS
5	5	Obec Trstěnice	Obnova obecní knihovny v Trstěnicích	-	36 900	-	Nevybrán k podpoře MAS
5	5	Obec Stará Voda	Obnova oken v sále společenského domu	22.8.2013	108 000	53 265	
5	5	Mikroregion Chebsko	Vybavení pro kulturní, společenské a sportovní aktivity obcí	-	371 156	-	Nevybrán k podpoře MAS
5	5	Obec Odrava	Přístavba a stavební úprava objektu Obecního úřadu Odrava	-	518 348	-	Nevybrán k podpoře MAS
5	6	Náboženská obec Církve československé husitské v Mariánských Lázních	Obnova fary	29.8.2013	179 679	179 679	
5	6	MŠ Velká Hleďsebe	Pořízení vybavení pro mateřskou školu	-	96 300	-	Nevybrán k podpoře MAS
5	6	Jezdecký klub Krásná	Zázemí pro jezdecký klub	29.8.2013	117 000	111 605	
5	6	ZŠ a MŠ Plesná	Veselá třída	6.9.2013	169 650	168 826	
5	6	TJ SOKOL Mariánské Lázně	Vybavení sokolovny	10.9.2013	178 425	178 425	



5	6	MŠ Krásná	Pořízení materiálně technického zázemí MŠ Krásná	29.8.2013	71 820	71 820	
5	6	Centrum pro volný čas	Vybavení pro činnost sdružení	9.9.2013	164 250	129 947	
5	6	ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart,	Vybavení učebny výtvarné výchovy	22.8.2013	150 300	147 511	
5	6	TJ JZD „ROZVOJ“ Trstěnice	Pořízení přenosných fotbalových branek na hřišti v Trstěnicích	28.8.2013	169 200	168 272	
5	6	ZŠ a MŠ Drmoul	Obnova vybavení na školní zahradě	-	180 000	-	Ukončena administrace SZIF
5	6	SDH Drmoul	Vybavení klubovny v hasičské zbrojnici	-	146 160	-	Nevybrán k podpoře MAS
5	6	SDH Stará Voda	Vybavení hasičské klubovny a jejího zázemí	-	125 100	-	Nevybrán k podpoře MAS
5	6	ZD Křižovatka – sportovní klub	Volný čas	27.8.2013	144 300	144 300	
6	5	Město Lázně Kynžvart	Vybavení knihovny v Lázních Kynžvart	-	77 130	-	Nevybrán k podpoře MAS
6	5	Svazek obcí Kamenné Vrchy	Společnou cestou	28.5.2014	435 000	435 000	
6	5	Město Skalná	Sportovní hala Skalná obnova sprch	-	133 450	-	Nevybrán k podpoře MAS
6	5	Město Plesná	Zasedací místnost	6.6.2014	262 240	262 240	
6	5	Obec Okrouhlá	Hrací venkovní prvky pro MŠ Okrouhlá	-	390 919	-	Nevybrán k podpoře MAS
6	5	Obec Dolní Žandov	Vybavení přísálí Kulturního domu v Dolním Žandově	-	144 000	-	Nevybrán k podpoře MAS
6	5	Obec Tři Sekery	Pořízení vybavení sálu ve Třech Sekerách	-	225 000	-	Nevybrán k



							podpoře MAS
6	5	Obec Drmoul	Obnova vybavení na školní zahradě	-	72 000	-	Nevybrán k podpoře MAS
6	5	Obec Krásná	Pořízení školního autobusu	10.6.2014	435 500	Probíhá kontrola ŽoP	
6	5	Obec Hazlov	Vybavení společenské místnosti	-	100 800	-	Nevybrán k podpoře MAS
6	5	Město Hranice	Vybavení společenského sálu Hranice	-	144 000	-	Nevybrán k podpoře MAS
6	6	Život na Dyleň	Stopovací zařízení a vybavení pro vytváření běžecké lyžařské stopy na území obce Lipová a Stará Voda	28.5.2014	97 830	97 331	
6	6	ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart	Vybavení tělocvičny ZŠ a MŠ v Lázních Kynžvartu	-	74 520	-	Nevybrán k podpoře MAS
6	6	Čtyřlístek, rodinné centrum Mariánské Lázně	Jazyková laboratoř	20.6.2014	160 000	134 759	
6	6	Mariánskolázeňsko, o. p. s.	Vybavení pro rozvoj kulturní činnosti II.	-	51 300	-	Nevybrán k podpoře MAS
6	6	TJ SOKOL Velká Hleďsebe	Pořízení technického vybavení pro TJ SOKOL Velká Hleďsebe	-	108 000	-	Nevybrán k podpoře MAS
6	6	SDH Drmoul	Vybavení klubovny v hasičské zbrojnici v obci Drmoul	-	90 990	-	Nevybrán k podpoře MAS
6	6	ZŠ a MŠ Drmoul	Vybavení školní jídelny ZŠ Drmoul	-	90 000	-	Nevybrán k podpoře MAS
6	6	ZŠ a MŠ Hazlov	Vybavení keramické dílny	-	73 800	-	Nevybrán k



							podpoře MAS
6	6	Náboženská obec Církve československé husitské v Mariánských Lázních	Vybavení fary	5.6.2014	99 043	99 043	
6	6	TJ SOKOL Mariánské Lázně	Renovace toalet	10.6.2014	180 000	180 000	
6	6	Centrum pro volný čas	Pořízení materiálního vybavení	-	29 700	-	Nevybrán k podpoře MAS
6	6	SDH Plesná	Zateplení hasičské zbrojnice	6.6.2014	116 000	116 000	
6	6	ZŠ Hranice	Pořízení barevné kopírky	10.6.2014	36 000	36 000	
6	6	TJ Jiskra Aš	Bezpečné branky pro mladé sportovce	10.6.2014	127 380	125 156	

